

日時:令和7年7月23日(水)9:00～11:40

場所:現地(先達山太陽光発電施設)

7月23日(水) 先達山太陽光発電所工事打ち合わせ

出席者: **福島市** 環境政策課 穴戸、富塚、大泉、柳澤、佐藤
農林整備課 吉田、平野、佐藤、長谷川、藤原
都市計画課 斎藤、佐々木

事業者 amp **奥村組**、**東芝プラント**
旭テクノプラント(管理会社)

1 amp報告

(1)工事進捗報告

- ・緑化工 現在100%(前回100%)
- ・補修緑化 8月末まで
- ・土工 現在 100%(前回100%) *面積100%(前回99.7%)
- ・パネル等設備 現在 約97%、パネルのみ97%(前回95%、パネルのみ84%)
- ・工事全体98% (前回96%)⇒ 7月末完成予定

(2)前回からの経過確認

- ・7/31に受電、経産省の試験に2か月、9月末に運転、11月中旬に引き渡し
- ・9月末から運用し、旭テクノプラントが管理していく。

(3)地元調整など

- ・濁度計設置し運用開始、旭テクノプラントが管理する。
- ・サイレンは小坂地区と音の調整を行って濁度計の占用を変更して設置する。
- ・濁度計、サイレン、監視カメラ、水位計は9月末までに試験運用
地元と市に情報共有できるようにする。
- ・8月中旬に県の林地開発検査予定

2 確認事項

(1)環境影響評価のフォトモンタージュ検証の報告⇒ 検証が進んでいない。

amp: パネル反射の対応を優先してほしいと県より依頼があった。

県から昨年10月に依頼があったが、パネル設置が完了しないと正確な検証にならないため完了時期を待っていた。

外部の専門業者に委託するよう投資家へ提案している。

どの時期にどの場所で反射があるのか、輝度(カンデラ)を基準にして検証する予定。

2か月はかかると思う。

(2)排水設備からの跳水による地山崩落個所の対策工法について

＊現地で補修箇所を確認

崩落個所は残置森林エリア。対策工事を県に届出してから進める予定

(3)排水設備の修繕と土砂浚渫の実施については完了

(4)調整池の状況把握と浚渫等必要な措置の実施について

amp: 1号、2号、3号調整池の設置工事完了後の維持管理における浚渫等の施工方法は、重機、バキュームを使用して行う。現在は、ほとんど堆積していない。

奥村組が法面を養生したうえで重機を搬入し浚渫を実施している。

土砂撤去の作業ヤードは設置済み。

4号調節地は人力で堆積土砂を排除する。

3 要請内容

市:7月14日付、要請文書を提出した。その説明

(1)パネルの反射について

市:先ほど説明があったが、市の職員がパネルの反射を直接確認している。

まずはエビデンスが必要。そのうえで対応していただきたい。

amp: 先ほど説明したとおり。検証を進めて結果が出たら示したい。

(2)緑化状況を踏まえた対応

市:遠くから見ると依然として表土が視認できる状態である。

県の林地開発完了検査後もAC7が責任をもって対応してほしい。

amp: 景観の改善には時間がかかる。まずは表土を落ち着かせたい。


現在の施工業者の奥村組から引き継いだ後も、適正に管理したい。

(3)市民への対応

市:市民団体、個人を問わず丁寧に対応していただきたい。


amp: 了解。

＊次回は、8月21日(木)10時から打ち合わせ予定

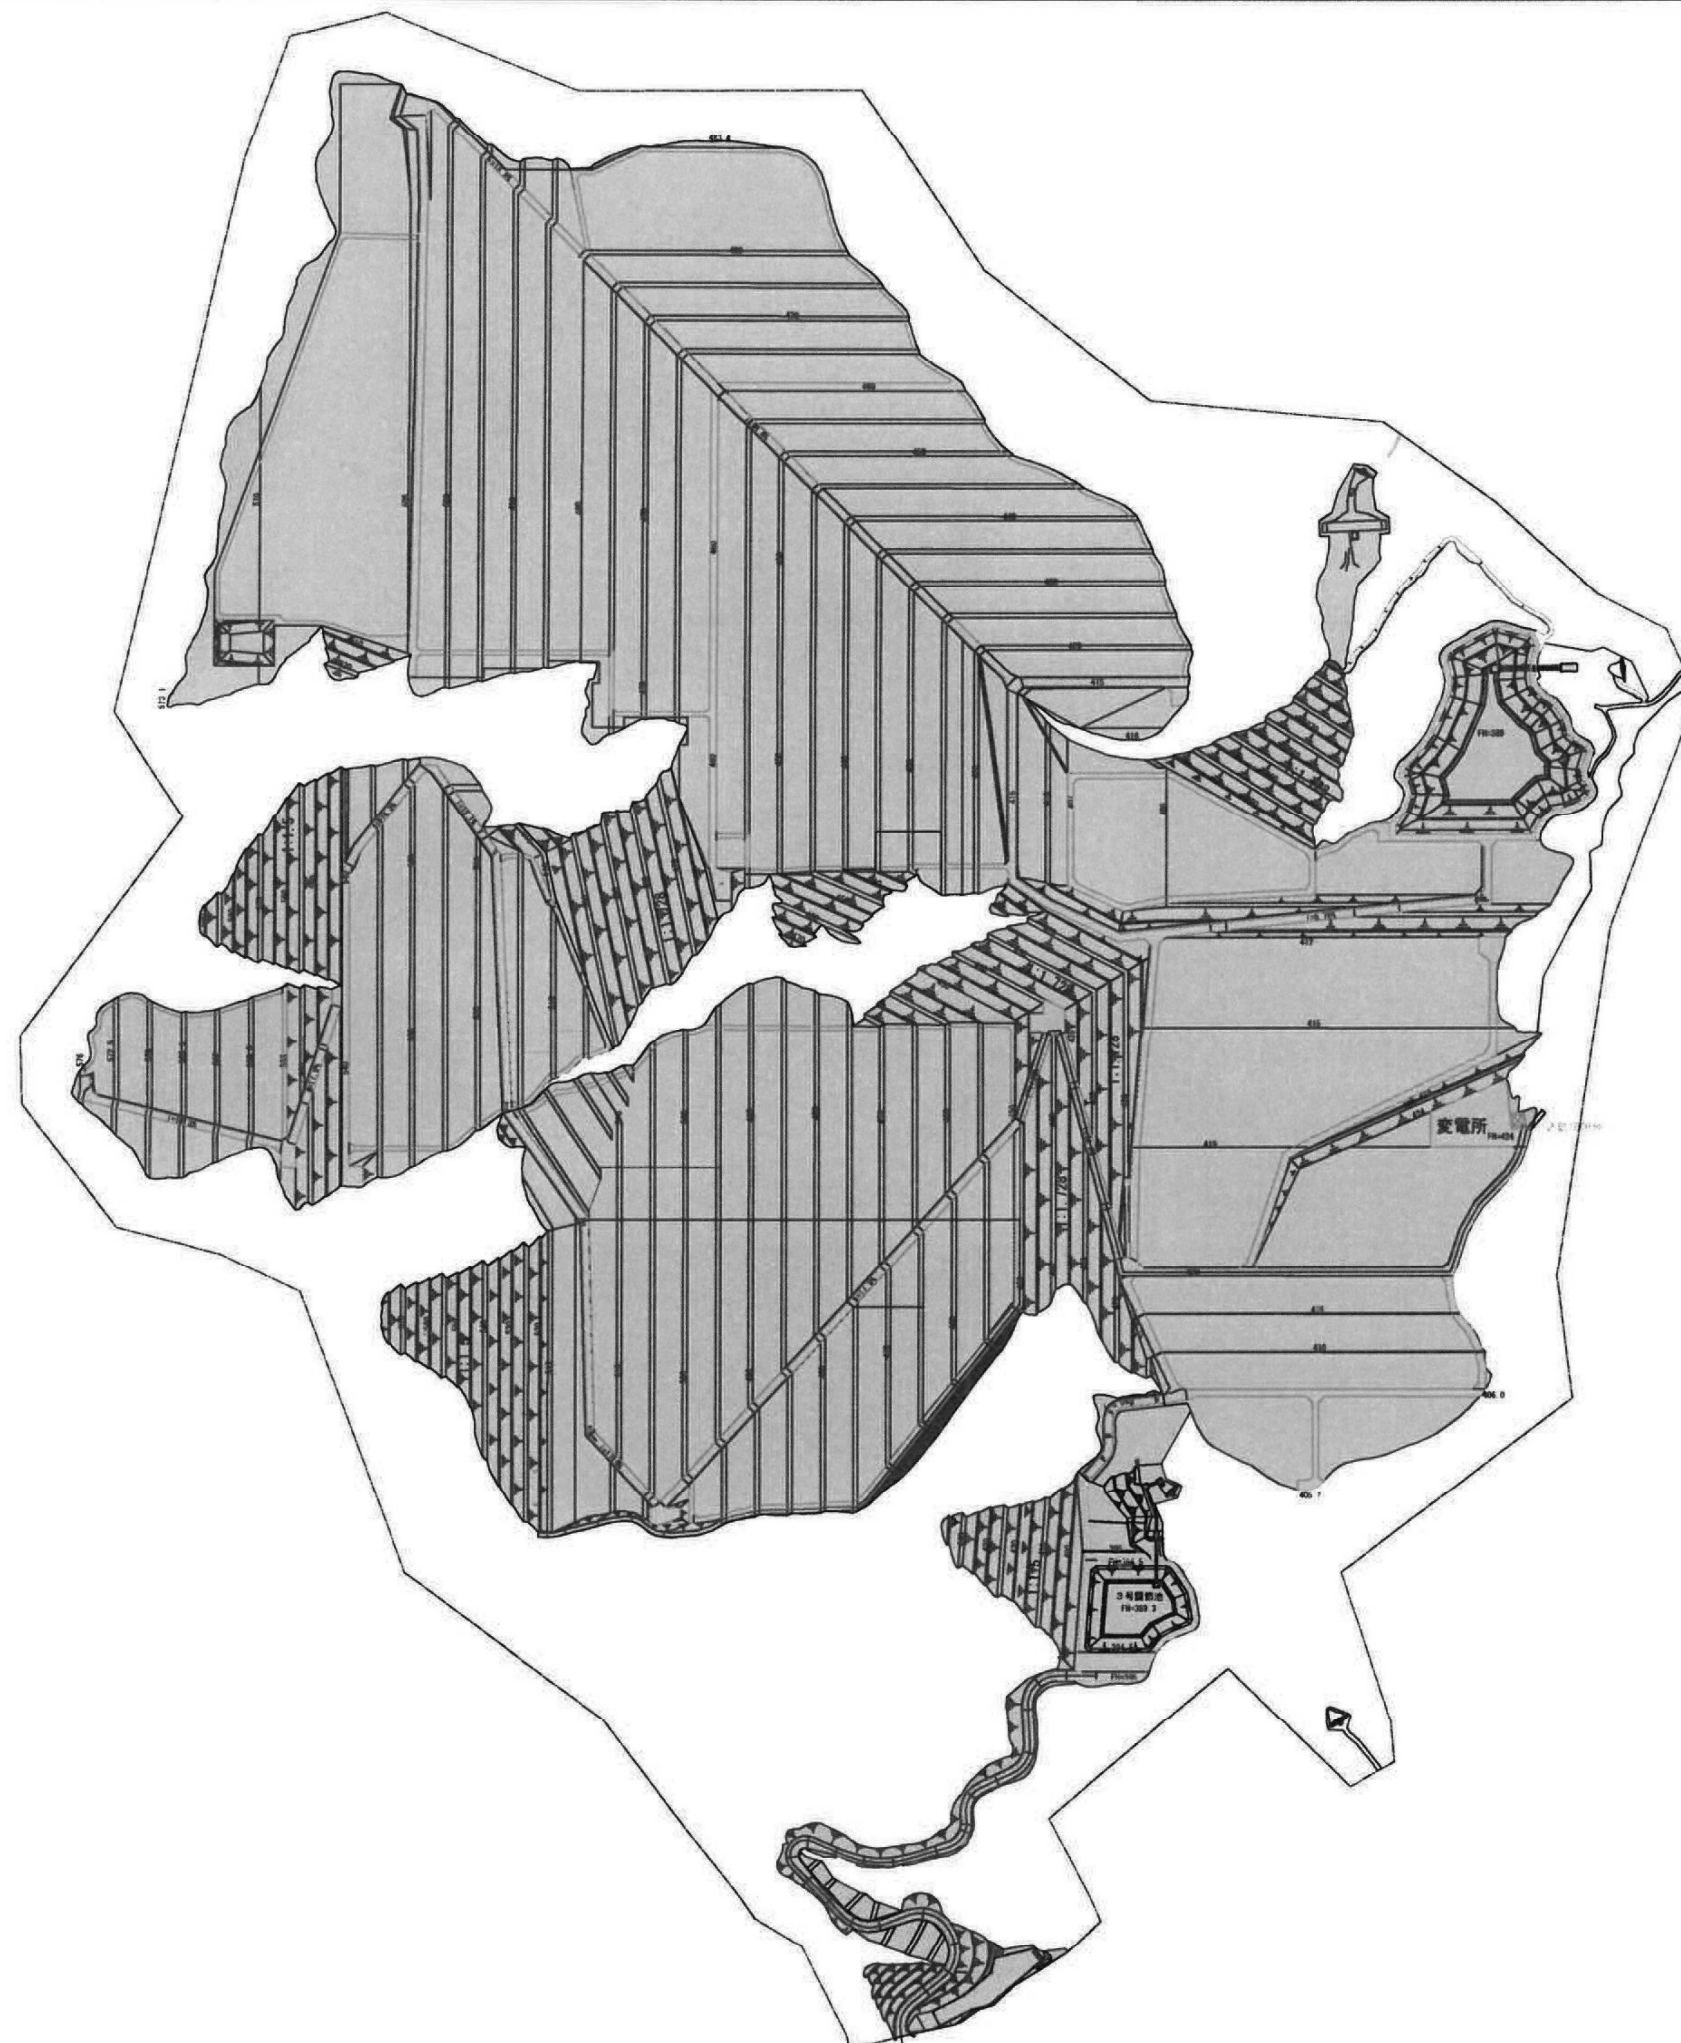

20250723_施工状況

凡例




施工完了


土工進捗率: (面積) 100.0%
(土量) 100.0%

福島先達山太陽光発電所
雨水排水側溝補修・土砂上げ作業キープラン

R3 2025年 7月 5日

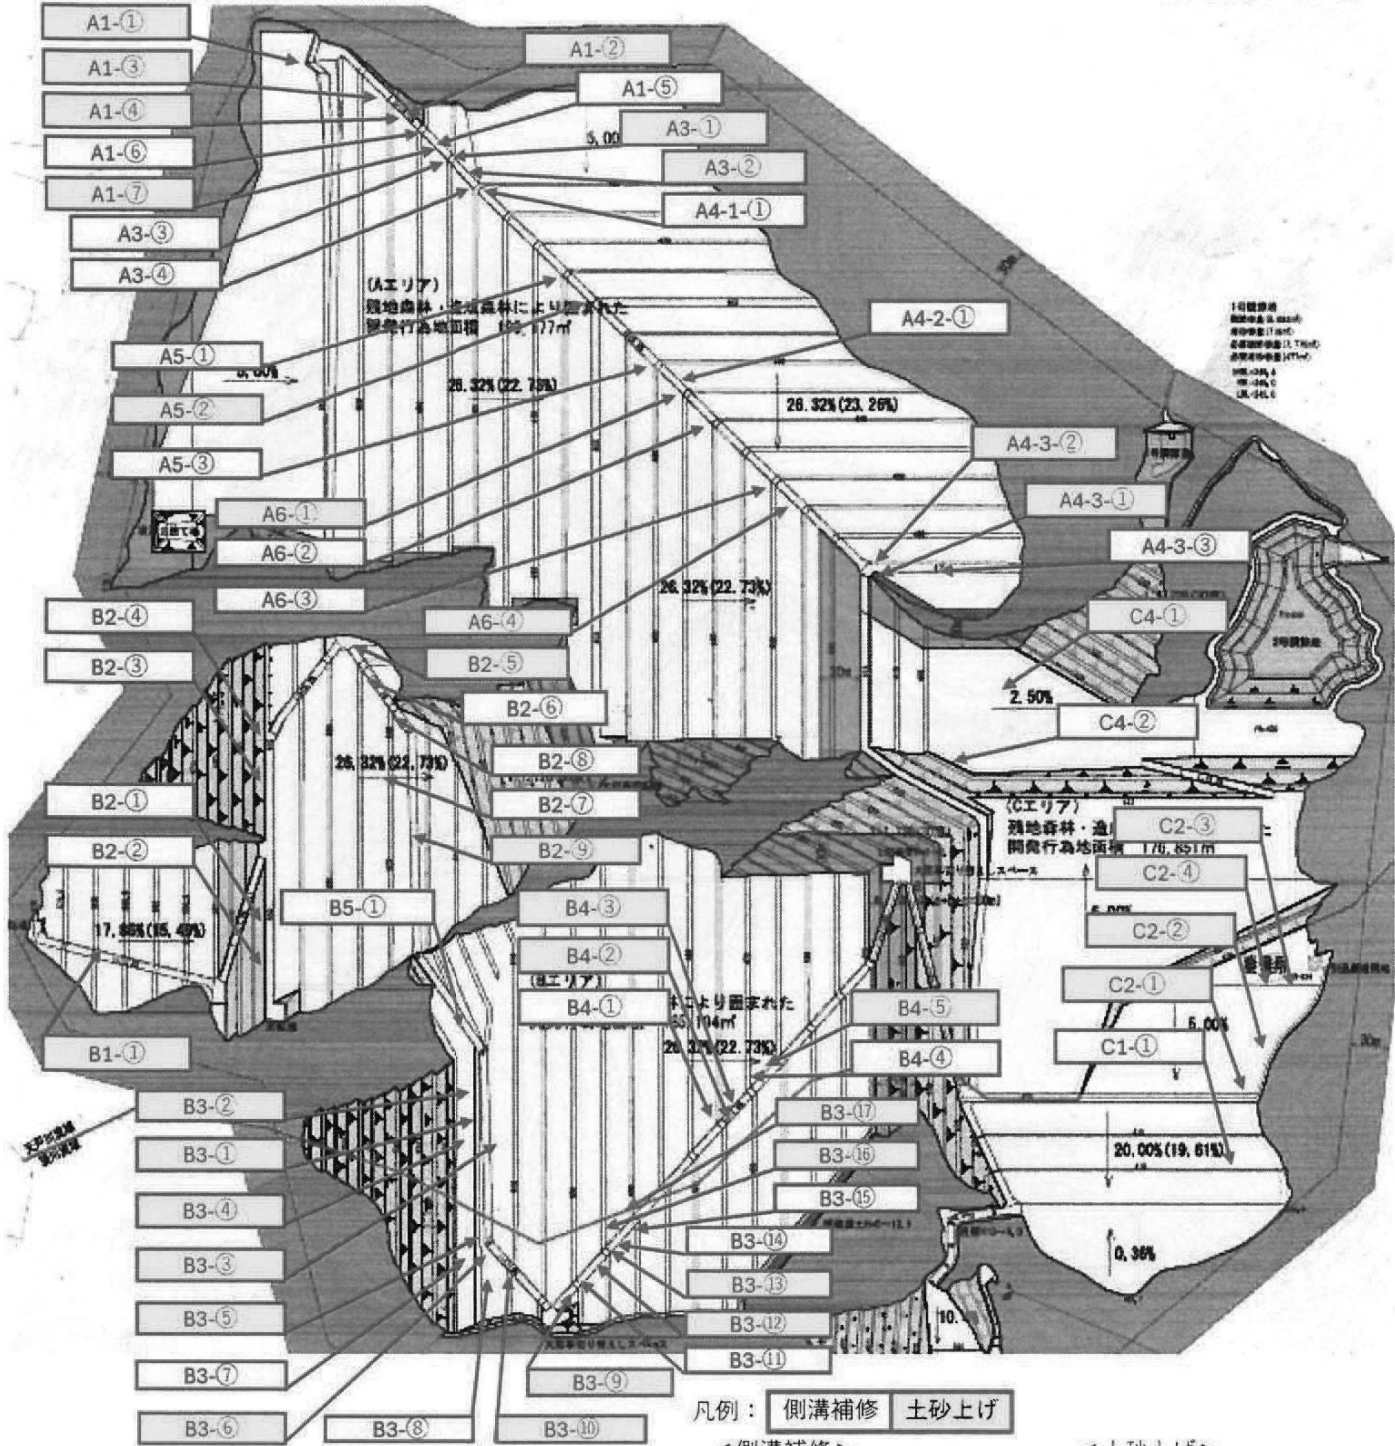

雨水排水側溝補修・土砂上げ作業スケジュール（2025年 7月 5日）												
エリア	側溝是正箇所数			完了箇所数		5月	6月				7月	備考
	合計	補修	土砂	補修	土砂	31	7	14	21	28	5	
A1	7	2	5	2 / 2	5 / 5						▼	
A3	4	2	2	2 / 2	2 / 2							
A4-1	1	1	0	1 / 1	-							
A4-2	1	1	0	1 / 1	-							
A4-3	3	1	2	1 / 1	2 / 2							
A5	3	2	1	2 / 2	1 / 1							
A6	4	2	2	2 / 2	2 / 2							
B1	1	0	1	-	1 / 1							
B2	9	7	2	7 / 7	2 / 2							
B3	17	5	12	5 / 5	12 / 12							
B4	5	2	3	2 / 2	3 / 3							
B5	1	1	0	1 / 1	-							
C1	1	1	0	1 / 1	-							
C2	4	0	4	-	4 / 4							
C4	2	1	1	1 / 1	1 / 1							
合計	63	28	35	28 / 28	35 / 35							

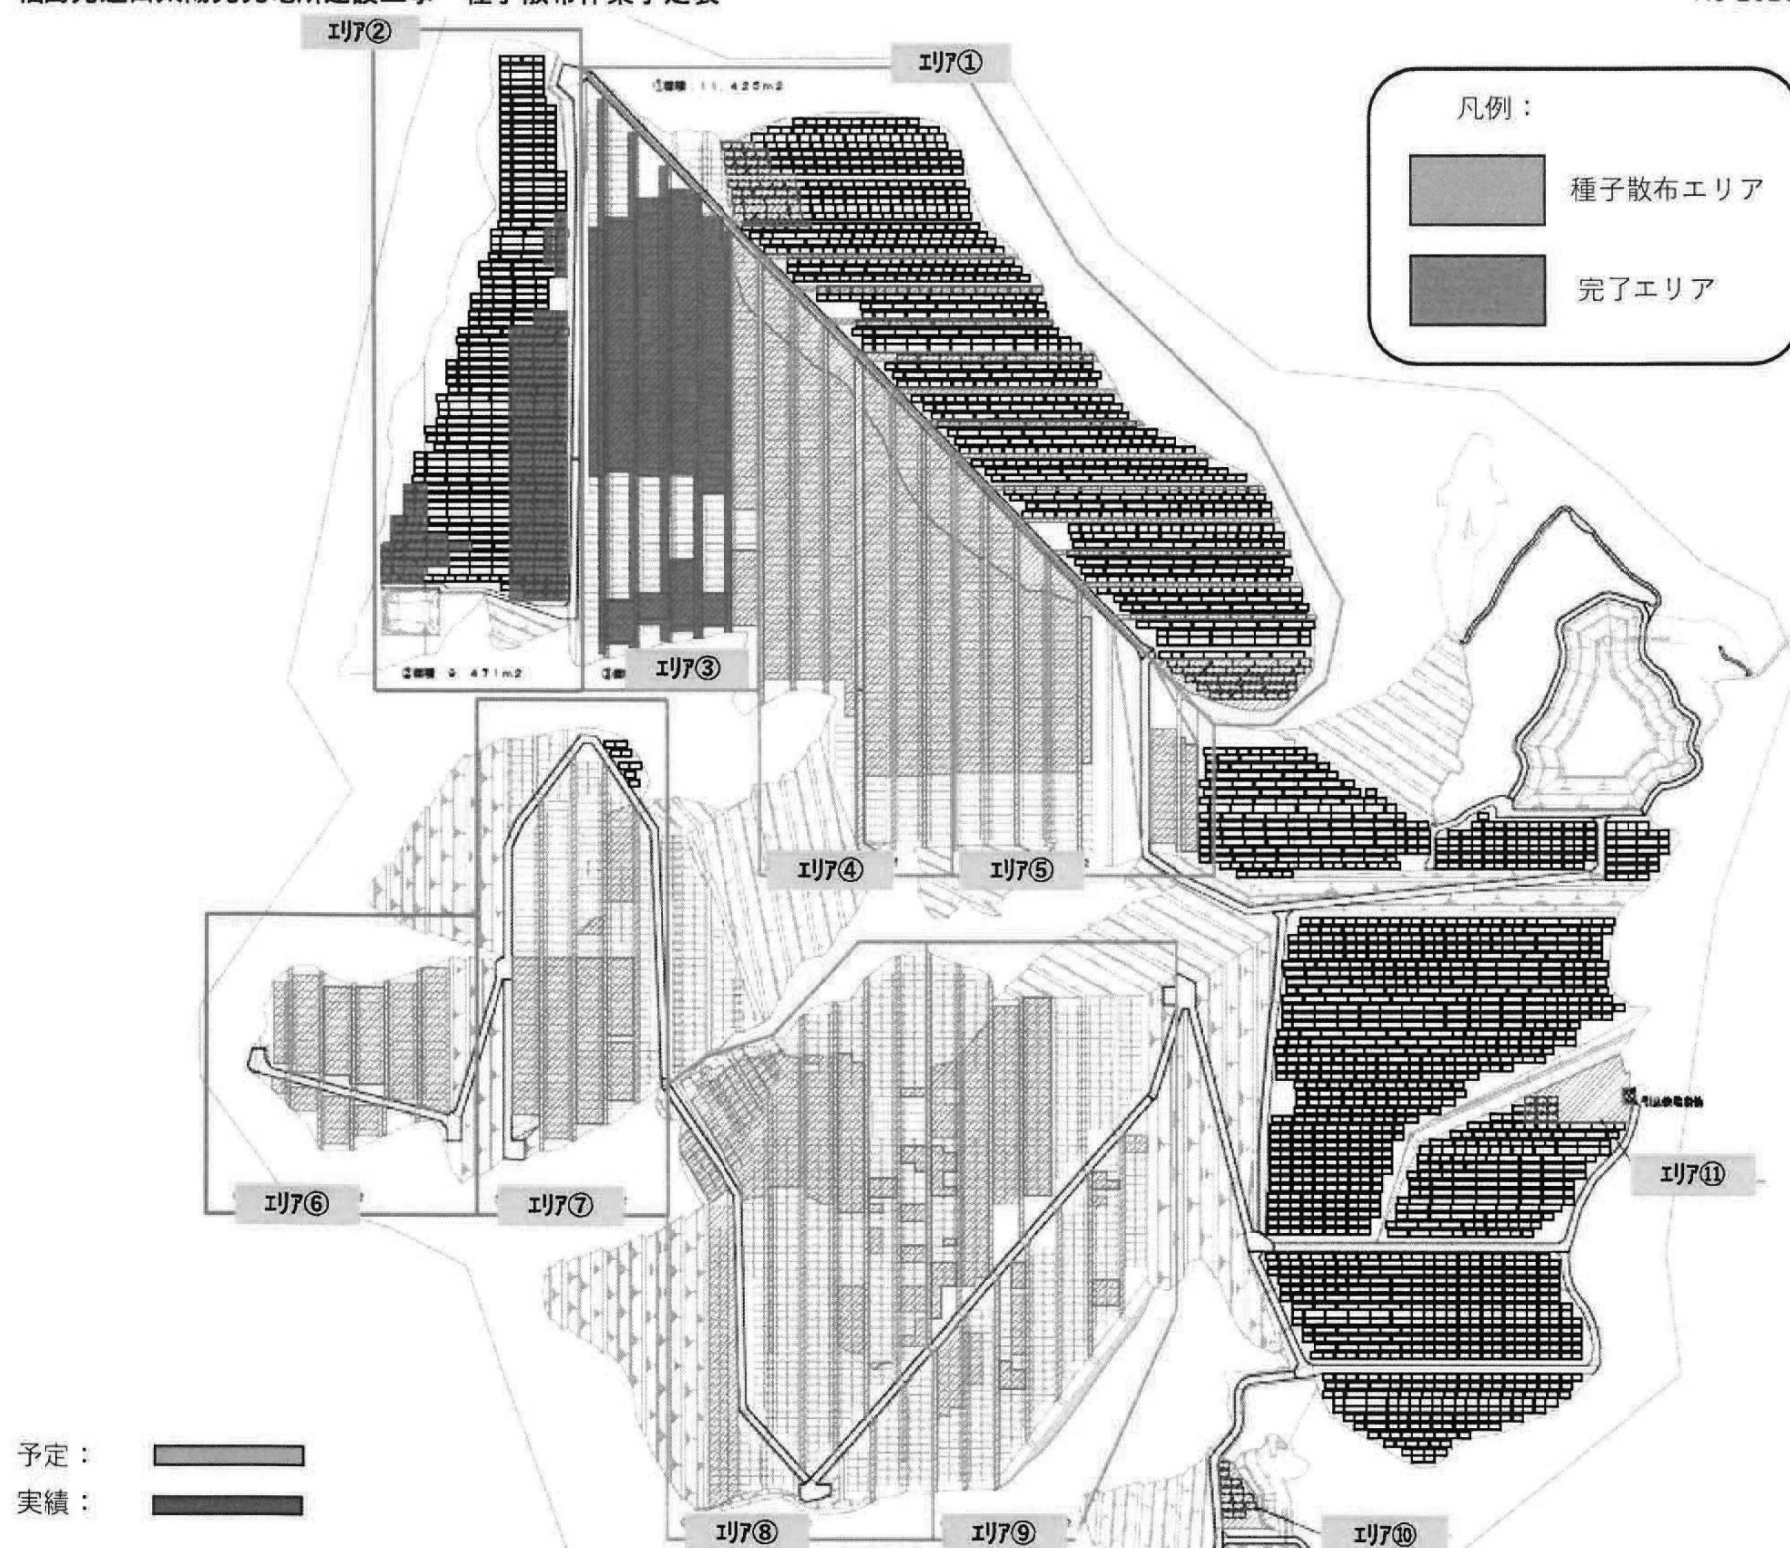[illegible]

太陽電池モジュール設置進捗状況（2025年7月18日時点）

