

日時:令和 7 年4月24日(木)9時

場所:現地確認+現場事務所

4月24日(木) 先達山太陽光発電所工事打ち合わせ

出席者: **福島市** 環境部 斎藤部長、千葉次長、環境政策課 穴戸、富塚、大泉、柳沢、佐藤
吾妻支所 嶋田、井口
農林整備課 吉田、佐藤(修)、長谷川
開発建築指導課 岡本、高山
都市計画課 佐々木
事業者 amp **奥村組**、**東芝プラント**、**旭テクノプラント**(管理会社)

1. 打ち合わせ前に現地確認を全員で実施(事業者からの説明及び市からの質問)

2. 打ち合わせ

斎藤部長あいさつ:市民からの声を受け、災害防除や景観の保全について改めて要請していく。
新条例により施工中や維持管理の報告をいただくようになる。

①amp報告

1)工事進捗報告

・緑化工 4/23 現在 100%(前回69.4%)

補修緑化 5月中旬から 8月中旬まで

・土工 4/23 現在 100%(前回99.7%) *面積99.7%
一部で改良が残っている。

・パネル等設備 4/23 現在 約85%、パネルのみ55%(前回77%、パネルのみ40%)

*工事全体 4/23 91% (前回87%)⇒ 7月末完成予定

2号調節池の浚渫を梅雨の前に完了させる。

7月末に受電、経産省の試験に2か月、9月末に運転、10月末までに引き渡し
9月末から運用し、旭テクノプラントが管理していく。

2)地元調整など

・濁度計 3/14 設置(金堀沢水路敷占用申請) 奥村組から旭テクノへ運用を変える。

5/14~5/31で切り替え 6/1から実施

サイレンは小坂地区と音の調整を行って濁度計の占用を変更して設置する。

・濁度計、サイレン、監視カメラ、水位計は9月末までに試験運用

・9月末から amp はプロジェクトマネジメント部門からアセットマネジメント部門に代わるが、地元調整があるので 〇〇 は残る。

・8月末に県の林地開発検査予定

amp 〇〇:

・先達山を注視する会 〇〇 〇〇 氏からの要請で 5/10(土)午後 4 時から 9 時 市民センターで対話会を開く。現地見学 4/30、5/9 予定。

他の現地見学会

・一般市民の視察 高湯温泉、小坂地区は完了

・新聞社 7 社とテレビ局は 4/26(土)

・姥堂地区、水上地区は 4/27(日)

・真由の会 4/28(月)

②その他 確認事項

市:市民からパネルの反射について意見があった。

amp:角度で市街地に反射光が届くことはない。パネルが鏡のようになるのでひかって見える。先ほど言われたが、曇っているときには雲が映って白く見えることがある。晴れているときは黒く見える。

市:環境影響評価のフォトモンタージュ検証の報告で、この辺の見解をまとめてほしい。


amp:了解。

amp:調節池 1, 2 号水位計+カメラは 6 月から運用する。3 号も 8 月中に運用する。

市へ ID とパスワードを渡すのでアクセスすることが可能になる。

*次回 5/30(金)10 時 市役所で打ち合わせ

以 上

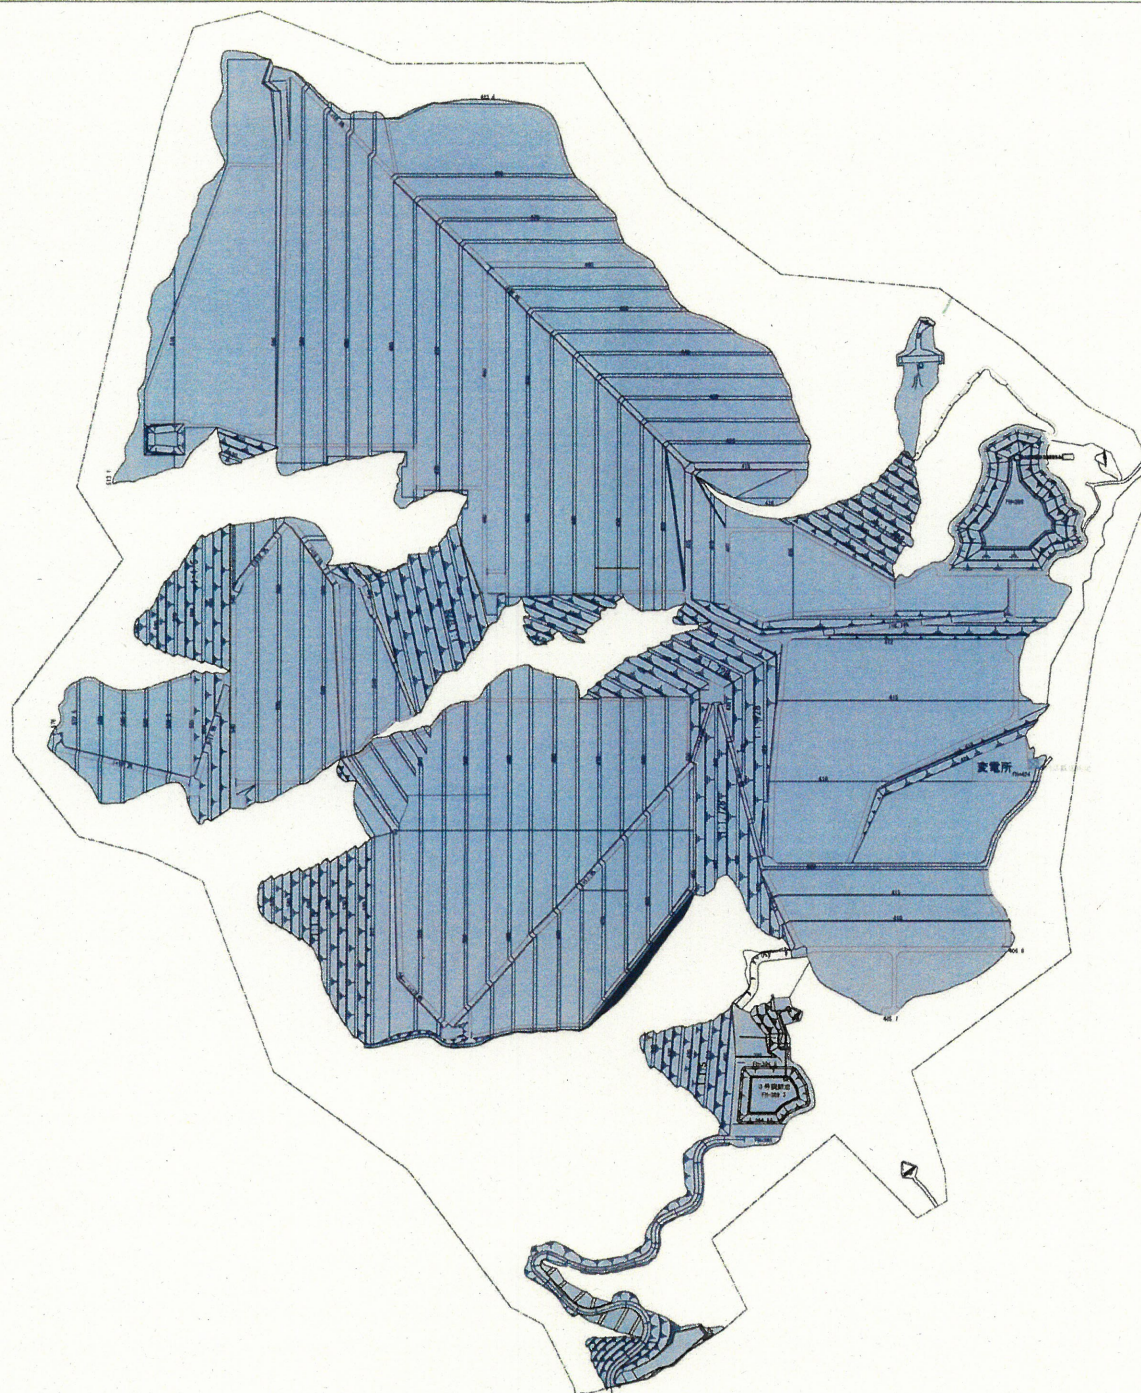

20250423_施工状況

凡例



施工完了

土工進捗率：(面積) 99.7%
(土量) 100.0%
