

所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課 員 (治山)	担 当 者
				 	

AC-7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年5月10日に現地確認を行いました。その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

- (1) 森林保全課 佐川主任、小泉副主査
- (2) 農林事務所森林林業部 蛭田課長、阿部主査、菅野副主査
- (3) 福島市佐藤係長、長谷川技査ほか1人
- (4) XXXXXXXXXX

2 用務の経過、結末等

事業者より工事の作業内容について説明があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

2号調節池、土工進捗状況



2号調節池



A工区の土工進捗状況

所 長	次 長	部 長	副部長	森林土木課長	課 員	担 当
						

復命書

令和6年6月4日 県道への泥水流出（高湯温泉太陽光施設の造成）の現地調査のため出張しましたが、その結果は下記のとおりです。

福島県知事 様

所属 県北農林事務所森林土木課

職・氏名 課長 蛭田利秀
主査 阿部由紀子
副主査 菅野聖

1. 用務地 福島市在庭坂字金堀沢ほか

2. 用務の結果・結末等

(1) 立会者

(2) 概況

令和6年6月2日の降雨の影響により、3号調節池上流部工事用道路の仮設排水施設（土側溝）が閉塞したため、雨水が工事用道路を横断し、直下の法面より、3号調節池の下流部の沢に流入した。

事業区域外に3号調節池を経ず雨水を直接流下させてしまったことと、仮設水路や応急的な排水対策を実施したことは、申請事業計画に従って施工しておらず、許可条件違反に当たると判断される。

なお、6月3日以降の事業区域外への雨水の直接流下はない。

○周辺区域への影響

上記の影響により、当該沢直下の県道に泥水を流出させた可能性が非常に高い。ただし、泥水の流出により、県道の通行止めは確認されていない。



②



④



①



③



⑥



⑧



⑤



⑦



(10)



(12)



(9)



(11)



(14)



(16)



(13)



(15)



(18)



(20)



(1)



(19)



22




24



21



23

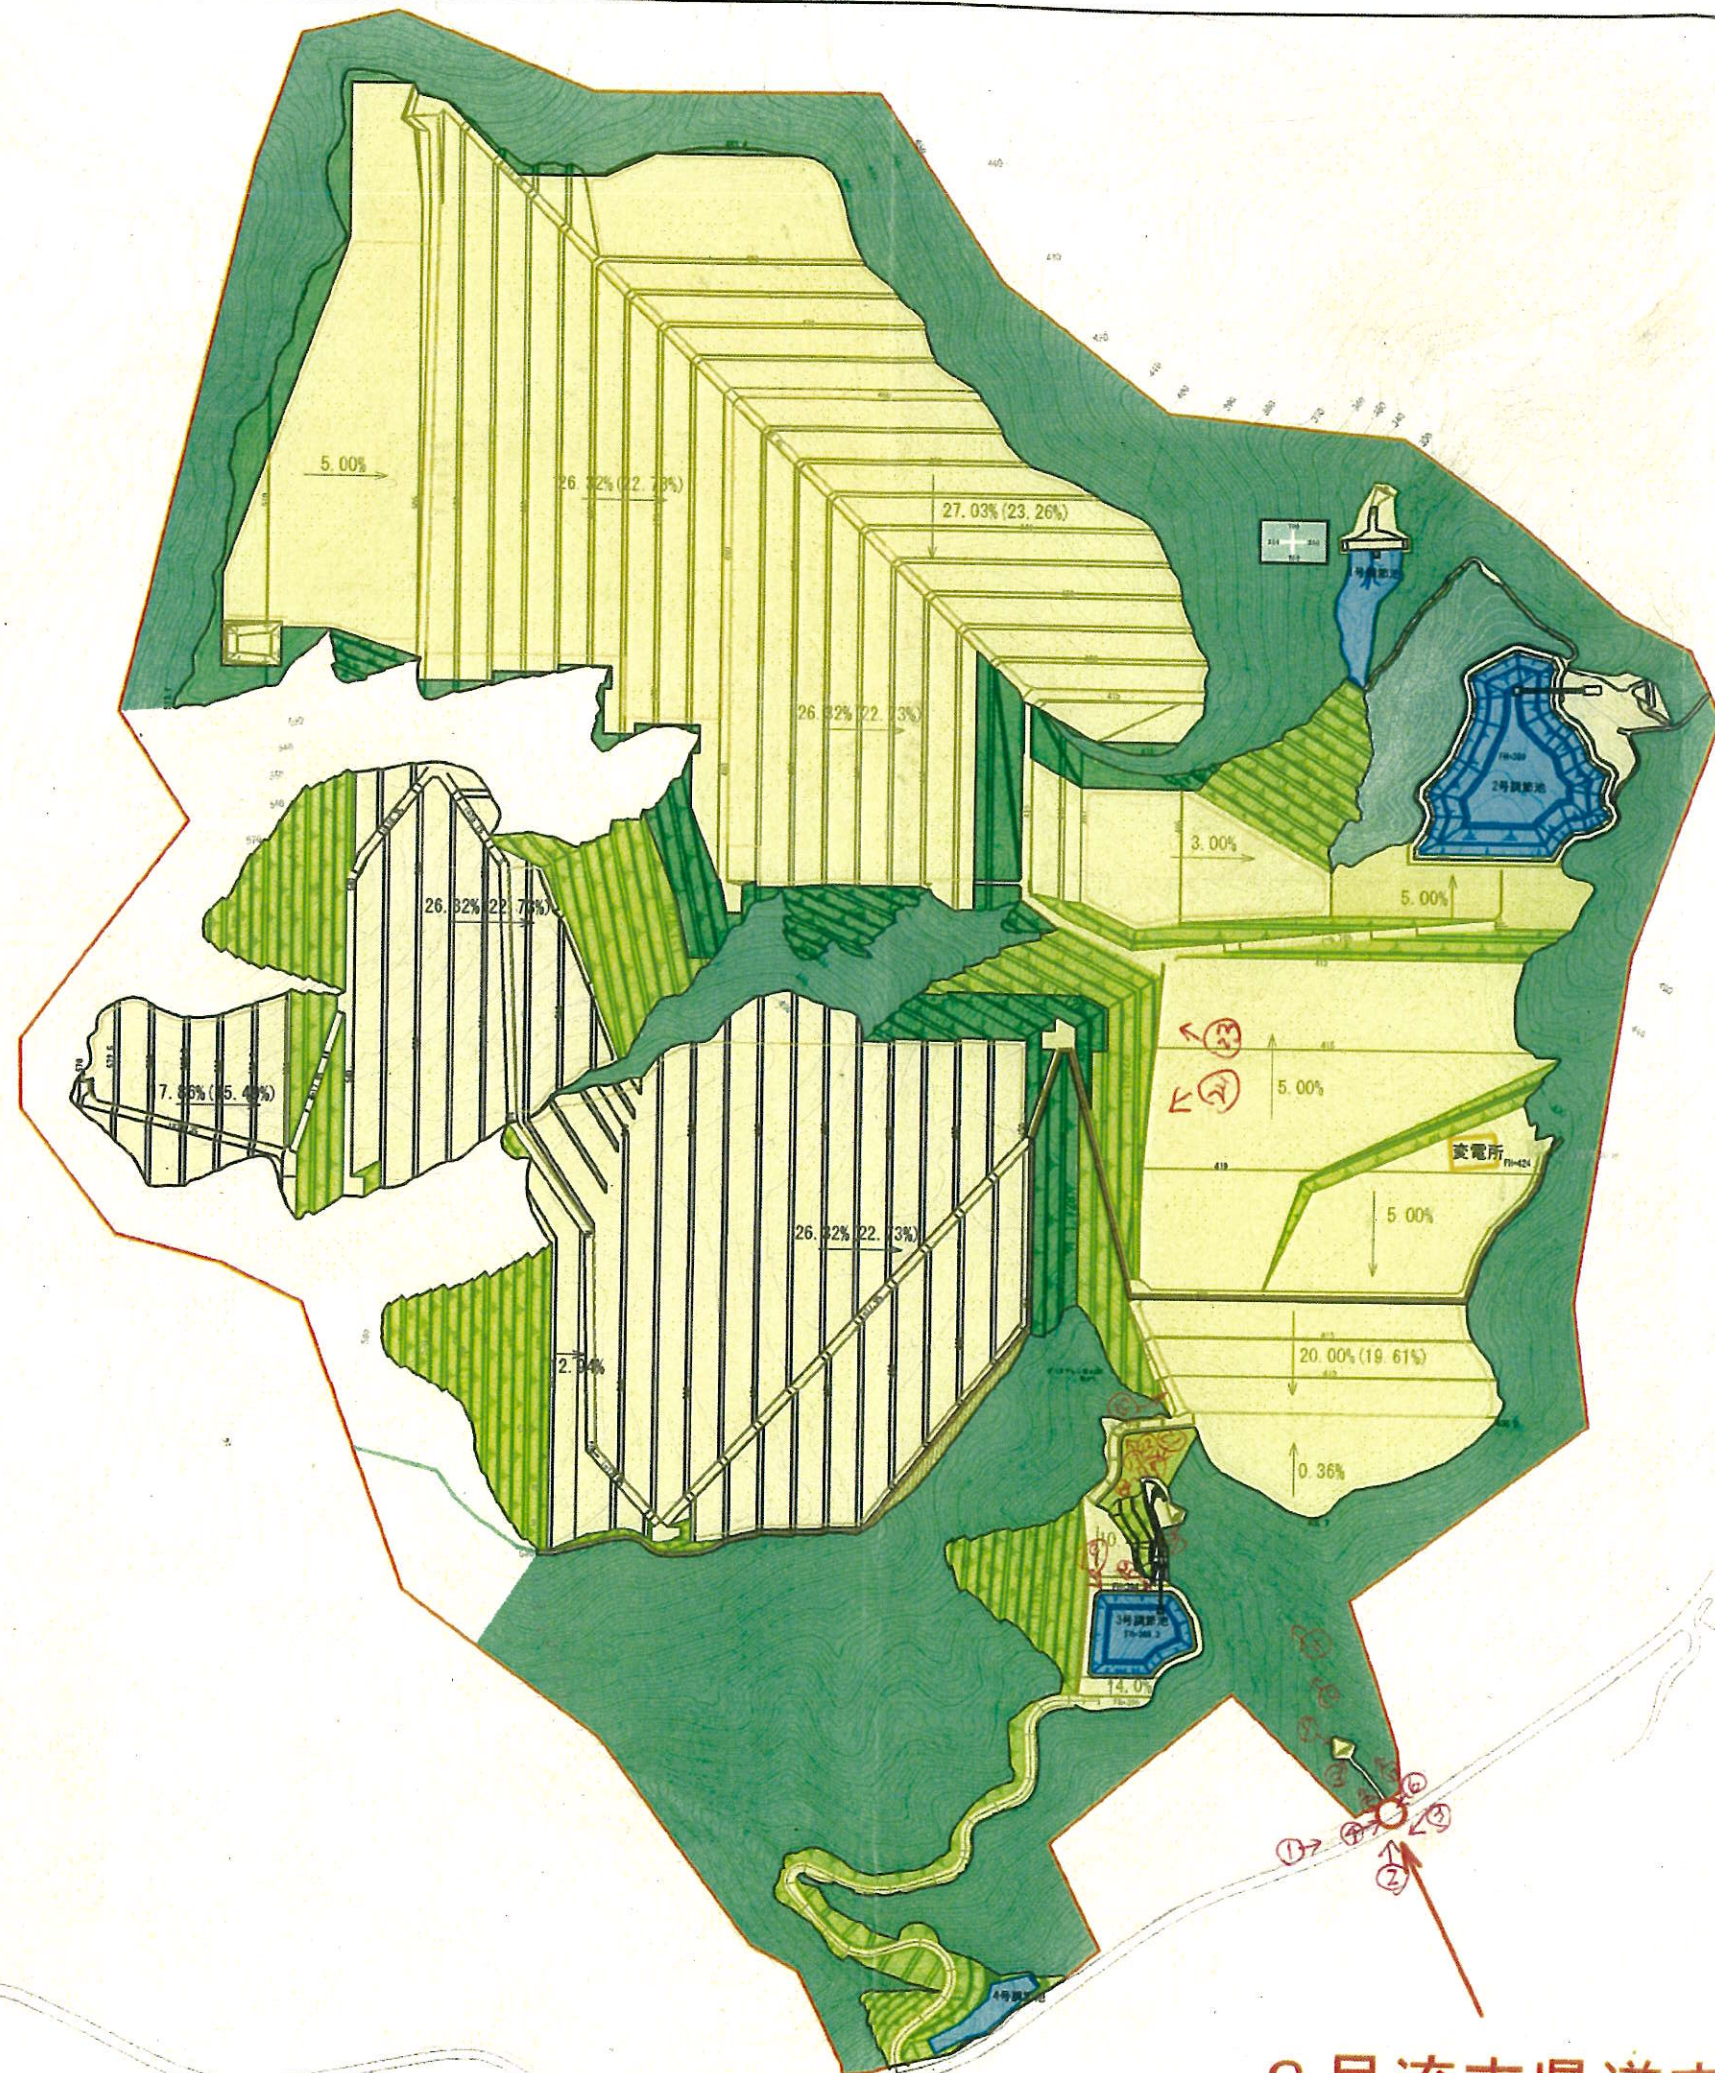

土地利用表

区分	記号	名称	面積 m ²	割合 %	森林率
施設		施設用地	470,769	49.7	
		防災調整池	16,735	1.8	
		計	487,484	51.5	
緑地		造成緑地	80,511	8.5	(60.0)
		造成森林	33,805	3.6	
		残地森林	342,128	36.1	
		計	456,484	48.2	39.7
公共施設		付替里道	2,980		
		計	2,980	0.3	(0.3)
合計			946,928	100.0	(100.0)

※造成面積604,800m²(付替え里道含む)

工事名称	(仮)高湯温泉太陽光発電所		
事業主名	A C 7 合同会社		
図面名称	土地利用計画図		
図面番号	6-1	縮尺	1:2,500 (A1)
作成年月	令和3年2月	縮尺	1:5,000 (A3)
照査		設計者	

3号流末県道交差部

部 長	副部長	林業課長	林業課 課 長	課 員	主 任
					

令和6年6月14日

現地確認

3号調整池付近



令和6年6月14日 現地確認


3号調整池上流



側溝設置6/16（日）完了予定

令和6年6月14日 現地確認

3号調整池上流

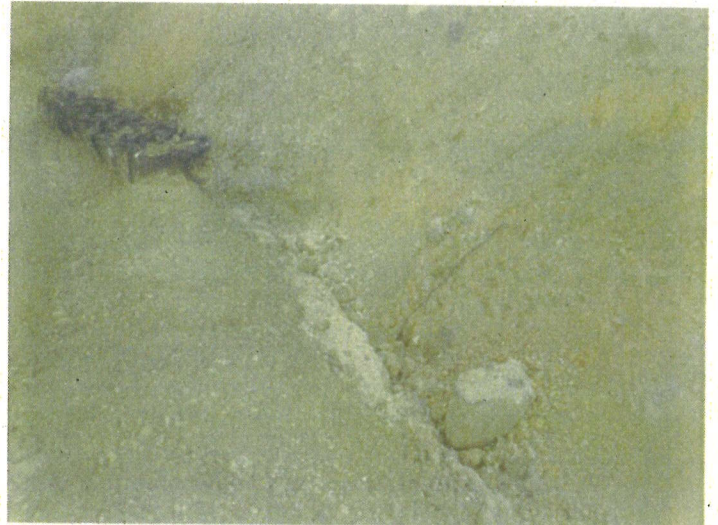

令和6年6月14日 現地確認



側溝天端までの路盤造成
6/21（金）完了予定

令和6年6月14日 現地確認

3号調整池上流



令和6年6月14日 現地確認

2号調整池上流



2号



マウンド設置・導水
6/16 (日) 完了予定

令和6年6月14日 現地確認



2号調整池下流



沈砂池
設置予定

ポンプアップ 6/17 (月) 開始予定



2号調整池下流

主	員	課	一長	課長	氏名	印
實野		阿部	蛭田	0	金成	國分

令和6年6月18日 現地確認

2号上流



3号上流部





令和6年6月24日 現地確認 9 3号調整池下流





3号調整池上流



令和6年6月24日 現地確認

3号調整池上流



令和6年6月24日 現地確認

3号調整池上流



令和6年6月24日 現地確認

2号調整池下流




令和6年6月24日 現地確認

2号調整池上流



令和6年6月24日 現地確認

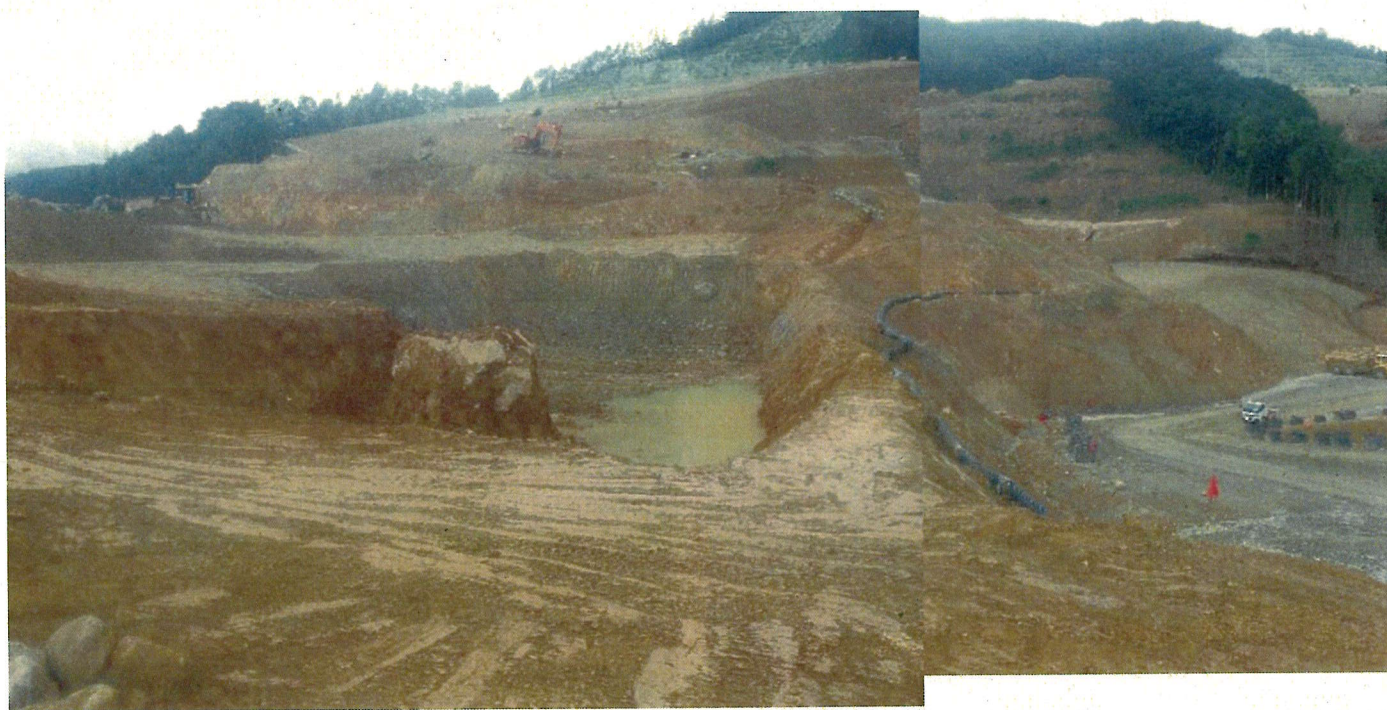

所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課 員 (治山)	担 当 者
				  	

AC-7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年7月17日に現地確認を行いました。その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

- (1) 農林事務所森林林業部 阿部主査、菅野副主査
- (2) 福島市農政部 菅野次長、吉田課長、佐藤係長、長谷川技査
- (3) 
- (4) 

2 用務の経過、結末等


事業者より工事の作業内容について説明があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

県道流末、3号調整池上流水路、パネル試験設置（モックアップパネル）箇所、植栽状況



県道流末

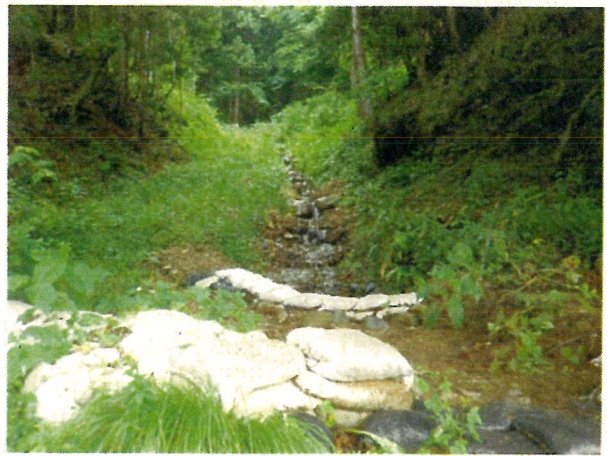

3号調整池（オリフィスからの流出なし）



3号調整池上流水路



3号調整池上流部 仮沈砂地



3号調整池上流部 仮沈砂地



全景





1号調整池上部



2号調整池



モックアップパネル（緑化状況）



植栽（コナラ）



植栽（コナラ）

所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課 員 (治山)	担 当 者
〇	〇				

AC-7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年7月24日に現地確認を行いました、その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

(1) 農林事務所森林林業部 金成主幹兼副部長、菅野副主査

(2) 

2 用務の経過、結末等

事業者より工事の作業内容について説明があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

3号調整池 (水はけが良く、水が溜まる)

3号調節池上流沈砂池

C工区掘削状況

1号調節池上流高盛土および2号調節池

2号調節池側道

。 本方に共有します。

部 長	副部長	林業課長	森林土木課長	課 員	主 任
					

R60724 AC7 現地確認



3号調節池 水位オリフィス以下を確認



3号池上流沈砂池 帯水状況を確認



C工区掘削状況 計画地盤まで切り下げる進捗を確認



1号調節池上流高盛土および2号調節池 進捗を確認



2号調節池側道 マウンド及び沈砂池を確認
