


所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課 員 (治山)	担 当 者
				  	

AC7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年8月26日に現地確認を行いました、その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

- (1) 農林事務所森林林業部森林土木課 蛭田課長、菅野副主査
 (2) 



2 用務の経過、結末等

事業者より 8/25 豪雨による影響について説明があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

- 3号調節池下流の県道部 (①②)
- 3号調節池 (③)
- 3号調節池上流 (④⑤)
- 2号調節池 (⑥)
- 1号調節池上流高盛土 (⑦)

写真撮影位置図

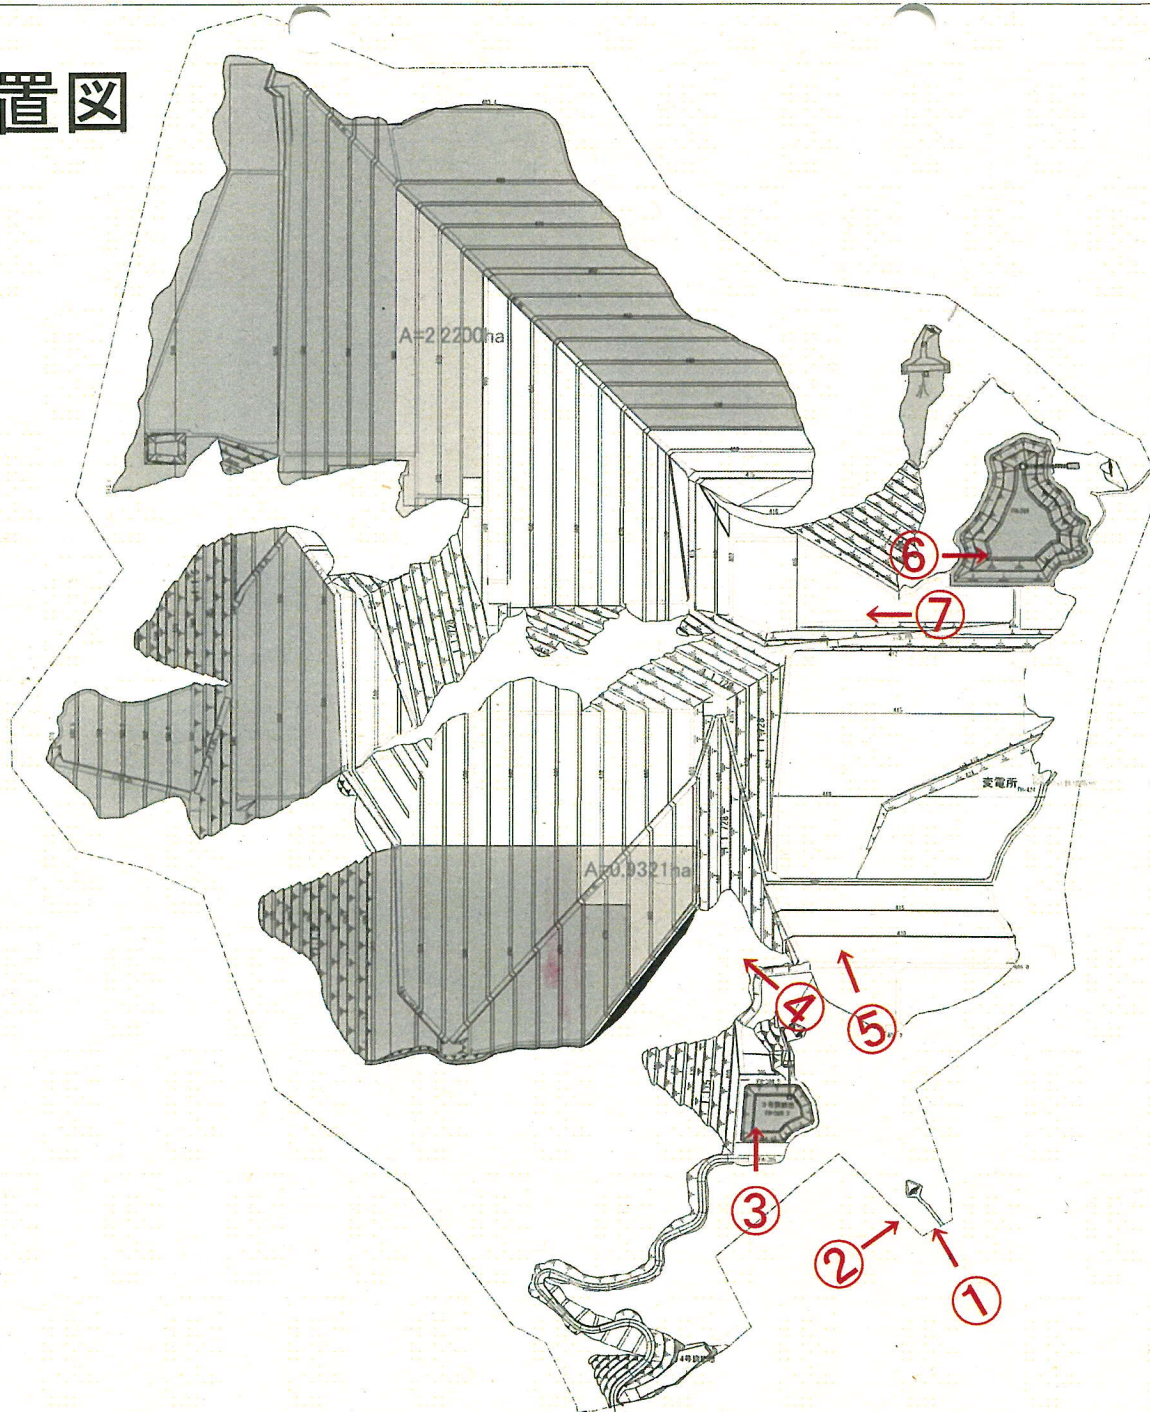

R60826 AC7 現地確認

① 3号調節池下流県道部



② 3号調節池県道部呑口



③ 3号調節池 堆積状況



④ 3号調節池上流 補強土壁下部から地上転がし配管の接合部が外れ、沢部洗掘した土砂が流出



⑤C工区下部の沈砂池



⑥2号調節池流入部の配管が外れ、池内側の一部法面を洗掘した



⑦1号調節池上流 高盛土部分



所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課 員 (治山)	担 当 者
				 	

AC7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年9月3日に現地確認を行いました。その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

- (1) 県北農林事務所森林林業部主幹兼副部長 金成祥実、森林土木課副主査 菅野聖
 (2) 

2 用務の経過、結末等

事業者より 8/25 豪雨による復旧状況について説明があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

3号調節池上流 (①) 地上転がし配管を再設置し復旧した。


2号調節池流入部 (②) 地上転がし配管の末部を水上に出るように短くし、法面保護のためブルーシートを設置し復旧した。脱落管は回収済み。

2号調節池上流沈砂池 (③) 堆砂状況等を確認した。

1号調節池放水塔 (④) 堆砂状況等を確認した。

3号調節池オリフィス (⑤) 水量がオリフィス以下であり流出していないことを確認した。

写真撮影位置図

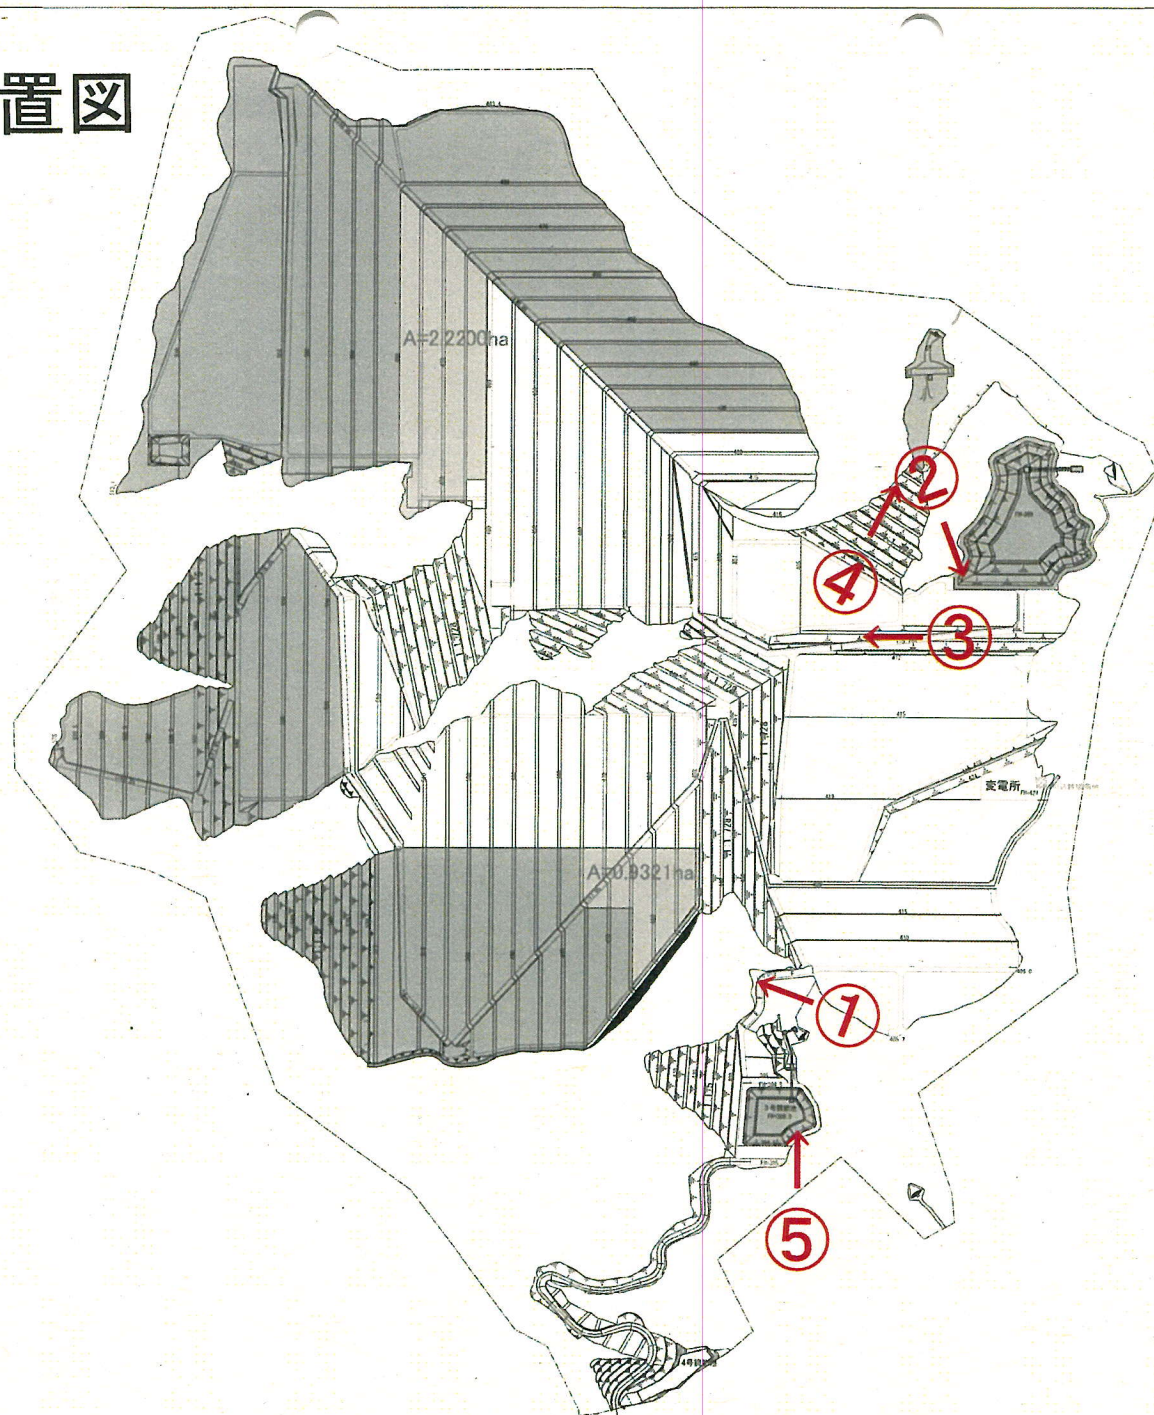


R60903 AC7 状況写真

① 3号調節池上流 仮設転がし配管復旧状況




② 2号調節池流入部 配管復旧状況

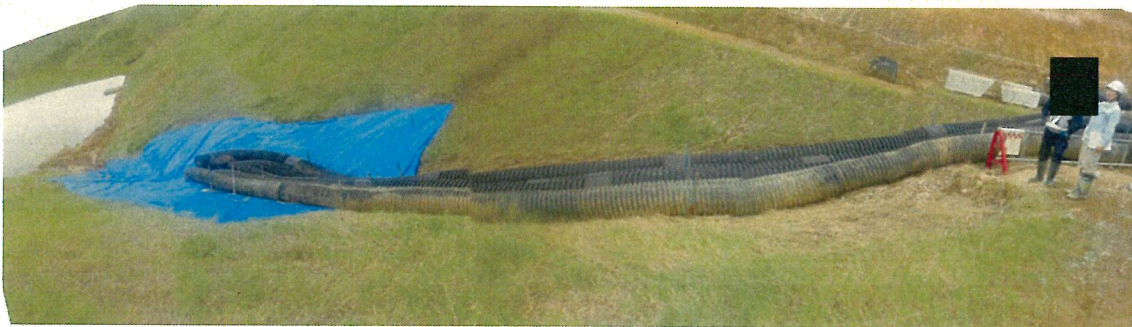


③ 2号調節池上流 沈砂池



④ 1号調節池放水塔

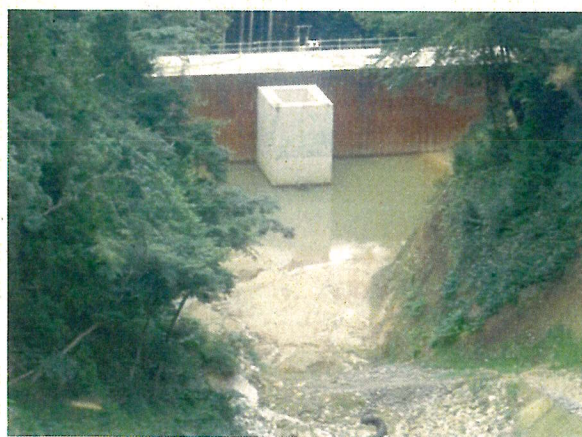

⑤ 3号調節池オリフィス

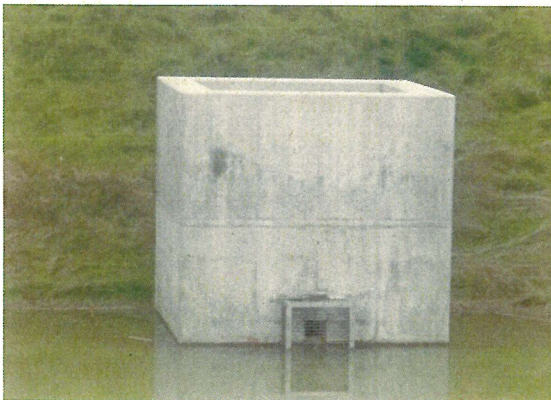

所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課 員 (治山)	担 当 者
					

AC7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年9月19日に現地確認を行いました、その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

- (1) 県北農林事務所森林林業部長 國分真悟、森林土木課長 蛭田利秀、副主査 菅野聖
(2) XXXXXXXXXX

2 用務の経過、結末等

事業者より工事進捗状況について説明があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

3号調節池下流 県道合流部(①) 仮設構造物の雨水流下状況を確認した。


2号調節池流入部(②) 雨水流下状況を確認した。

2号調節池上流沈砂池(③) 堆砂状況等を確認した。

1号調節池放水塔(④) 浚渫状況を確認した。

3号調節池オリフィス(⑤) オリフィスからの流下状況を確認した。

写真撮影位置図

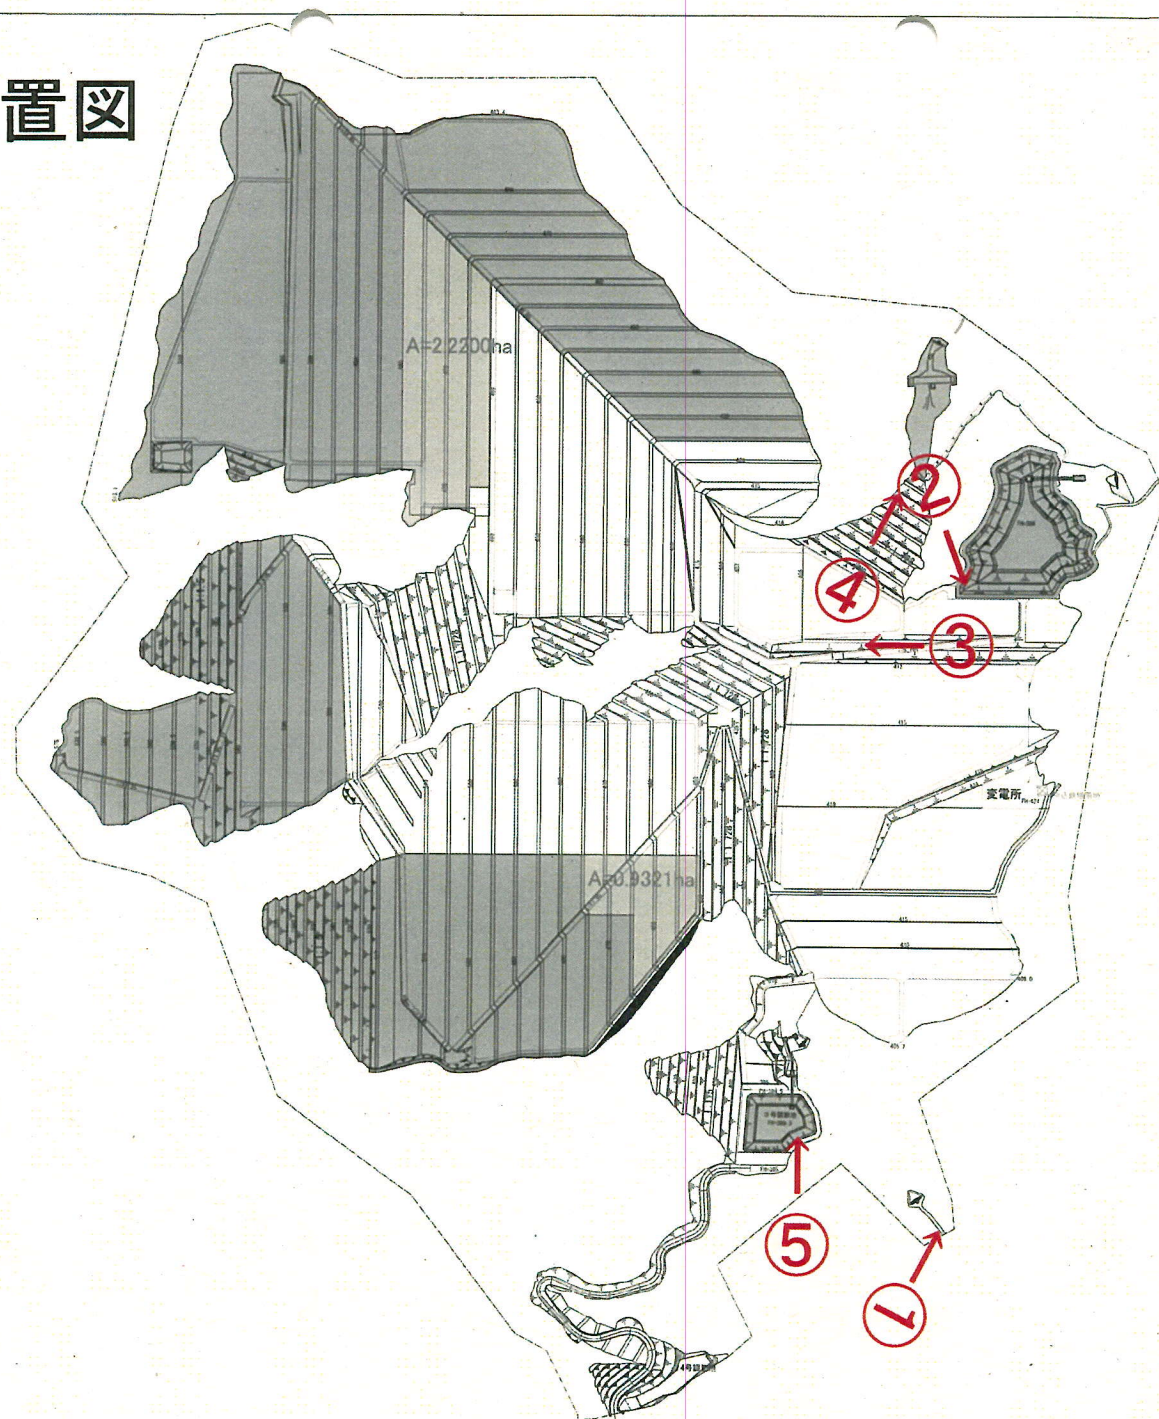

R60919 AC7 状況写真


① 3号調節池下流 県道合流部状況



② 2号調節池流入部




③ 2号調節池上流 沈砂池

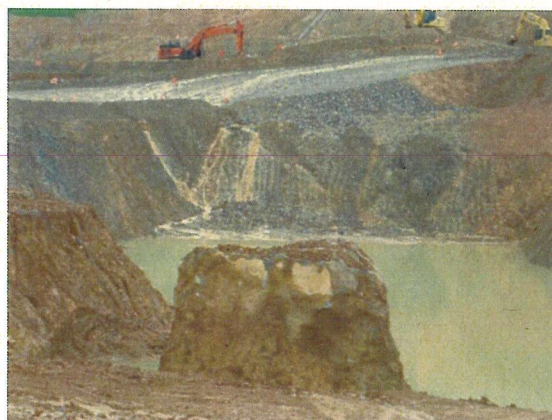

④ 1号調節池放水塔（浚渫中）




⑤ 3号調節池オリフィス

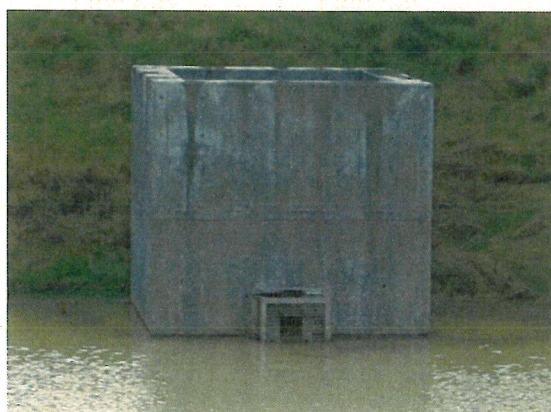

大岩（イオウ破砕）

写真撮影位置図

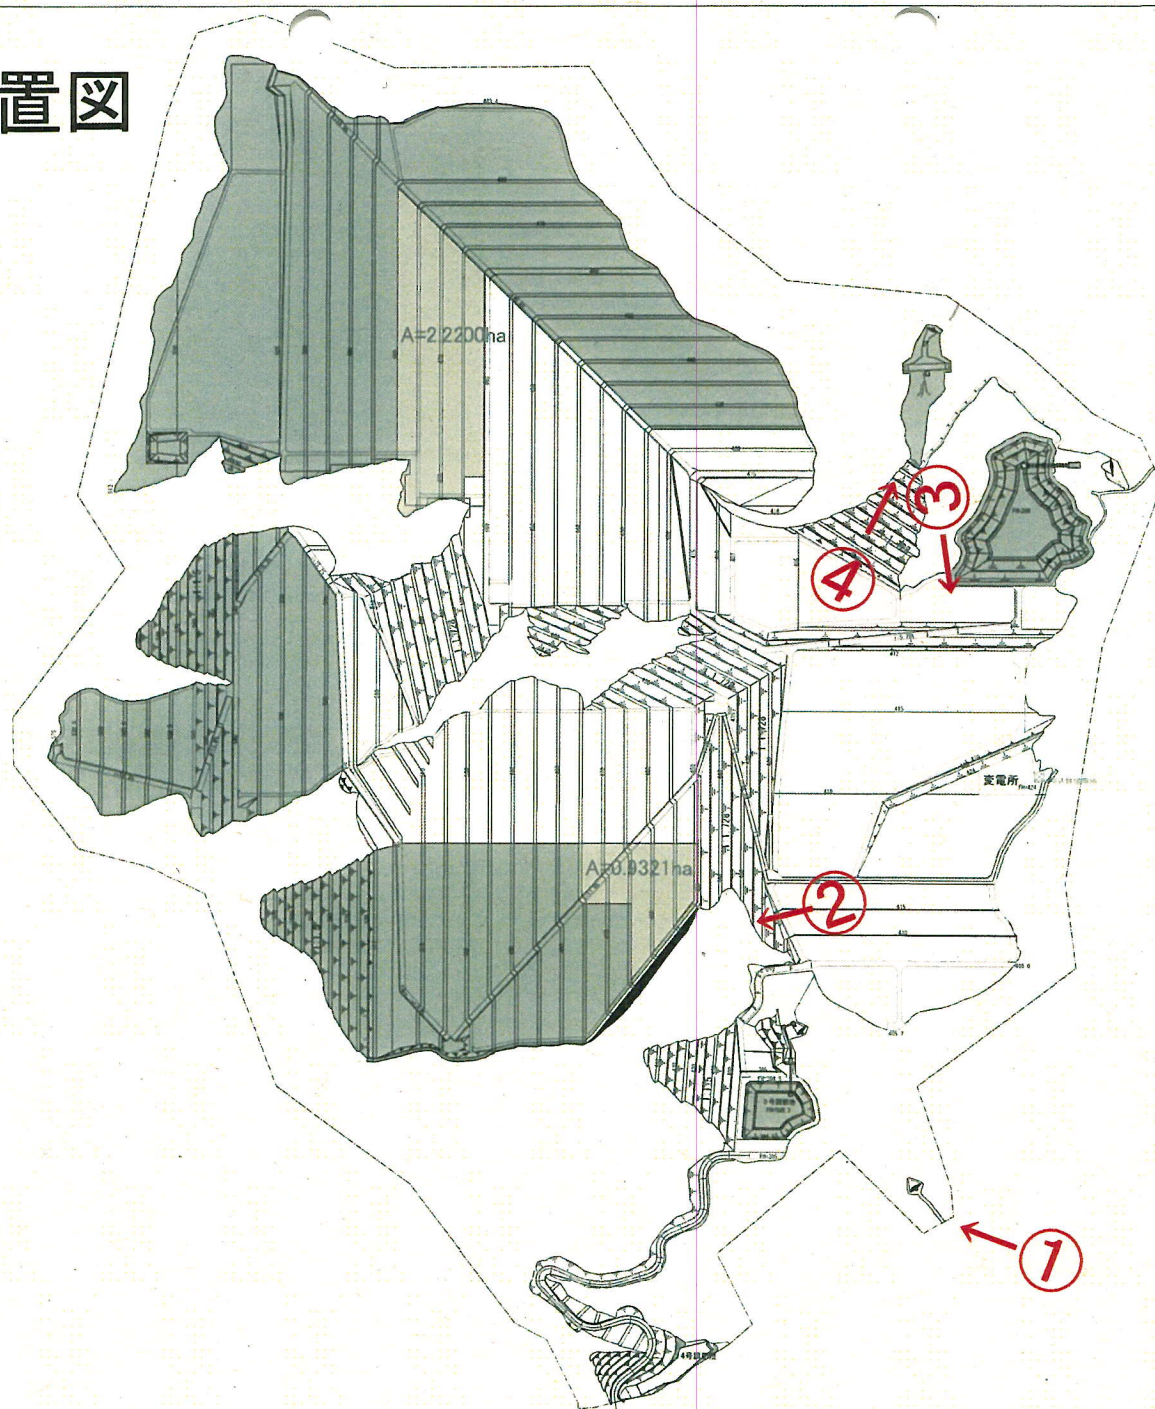

R60925 AC7 状況写真

①調節池下流 県道合流部



④1号調節池放水塔



②3号調節池上流



③2号調節池流入部



所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課長	課 員 (治山)	担 当 者
				(佐田)		

AC7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年10月3日に現地確認を行いました、その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

- (1) 県北農林事務所森林林業部森林土木課長 蛭田利秀、副主査 菅野聖
- (2) XXXXXXXXXX

2 用務の経過、結末等

事業者より現場進捗及び9/22の雨被害復旧状況について説明があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

4号調節池(①) 埋め戻し進捗を確認した。

- ・水路の接続が終われば完了する。

3号調節池上流(②) 地上転がし配管脱落及び残置森林状況

- ・倒木を撤去し、区域の面積を確認中である。
- ・変更届により残置森林を造成森林とする方針。
- ・崩落斜面はソイルセメントで保護し、ラス張りの上、緑化植栽する方針。

2号調節池流入部(③) 雨水流下状況を確認した。

- ・1号調節池の浚渫を優先させているため、9/22の雨により転がし配管が脱落したままとなっている。(表面排水より問題はない)



1号調節池放水塔(④) 浚渫状況を確認した。

- ・天候回復したため浚渫を再開した。

3号調節池オリフィス(⑤)


- ・土砂の堆積状況等を確認した。

写真撮影位置図

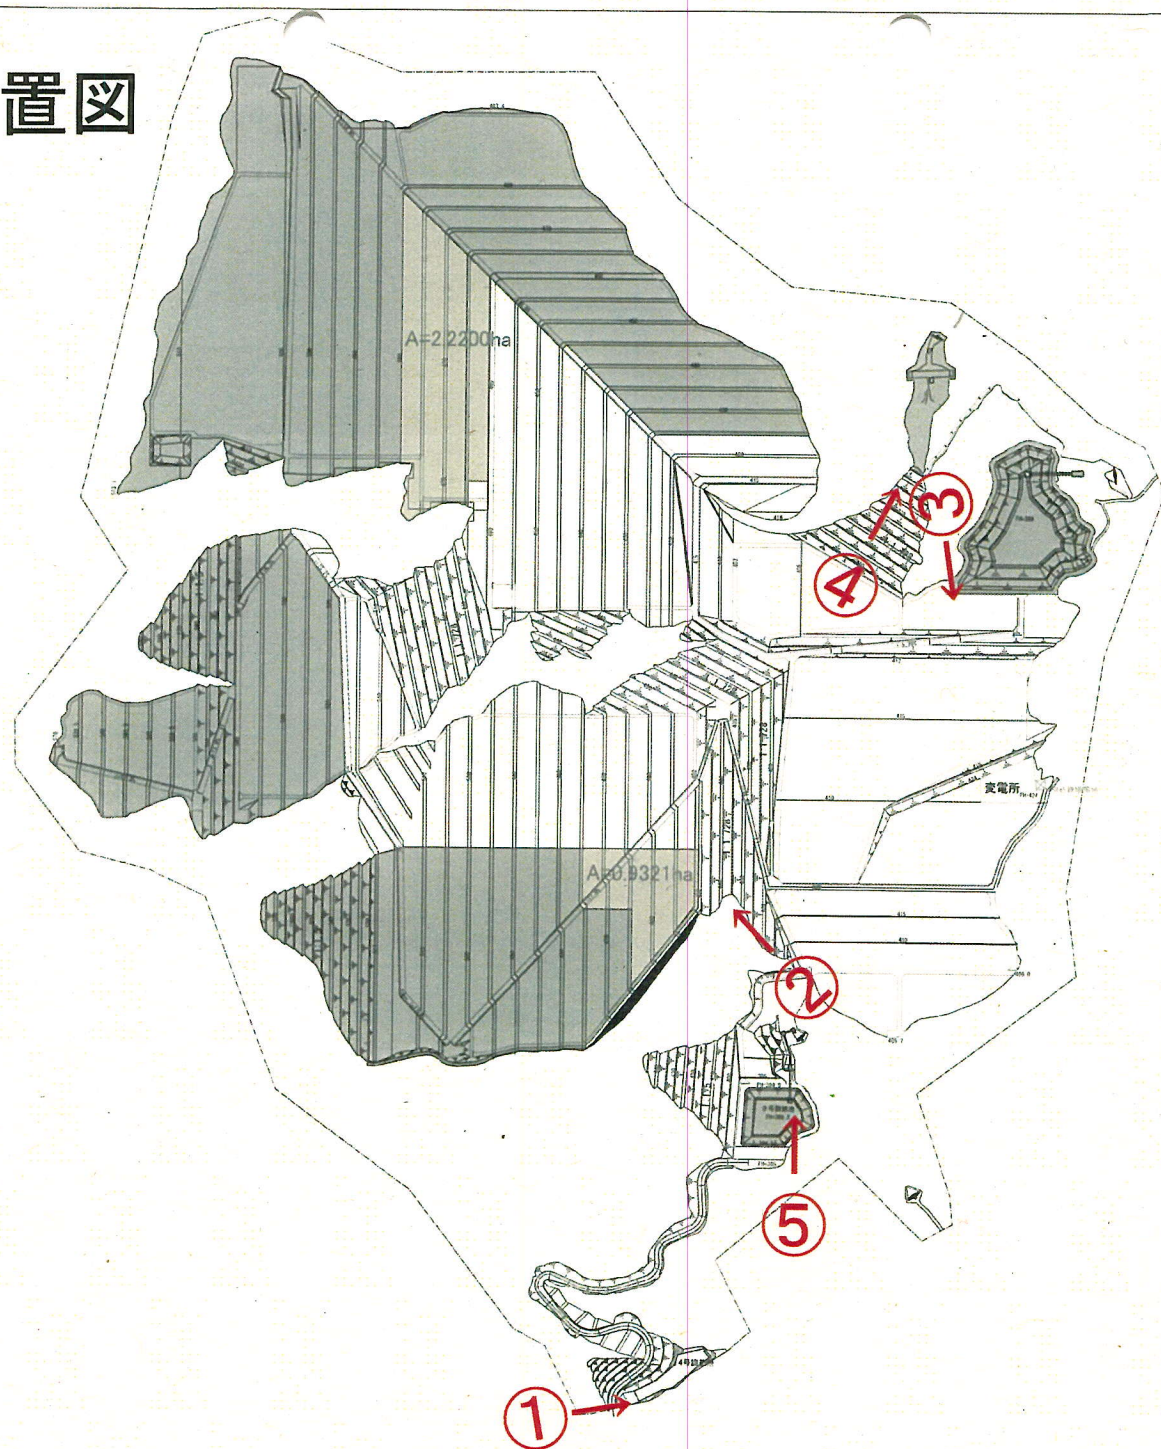

R61003 AC7 状況写真

① 4号調節池

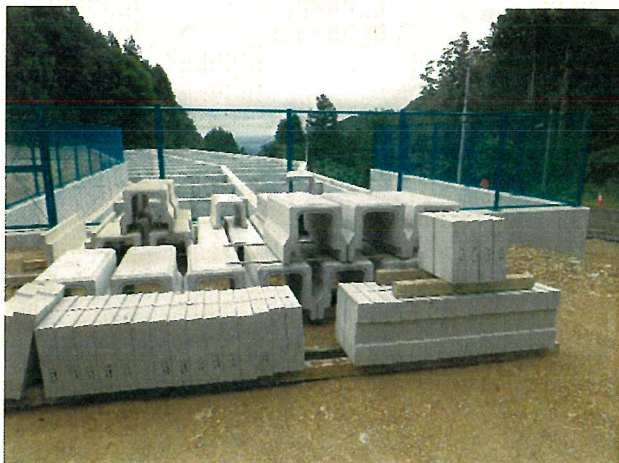

② 3号調節池上流



③ 2号調節池流入部



④ 1号調節池放水塔



⑤ 3号調節池オリフィス



所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課長	課 員 (治山)	担 当 者
						

AC7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年10月9日^(水)に現地確認を行いました^(注)が、その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

- (1) 県北農林事務所森林林業部森林土木課長 蛭田利秀、副主査 菅野聖
(2) XXXXXXXXXX

2 用務の経過、結末等

事業者より現場進捗及び9/22^(日)の雨被害復旧状況について説明があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

① 3号調節池下流県道沿い仮設

- ・雨による水量増加を確認した。φ200の管で流下していた。

② 3号調節池上流

- ・補強土壁下部からの地上転がし配管吐出口を確認した。写真撮影時、表面の落葉を撤去したことにより水が濁って写っている。
- ・B-2工区の表面排水地上転がし管の撤去を確認した。

③ 2号調節池流入部

- ・雨による水量増加を確認した。

④ 1号調節池放水塔

- ・浚渫を継続中だが、確認時はポンプ故障により中断していた。

⑤ 3号調節池オリフィス

- ・オリフィスからの流下を確認した。


⑥ A-1、A-2工区遠景

- ・パネル工事の進捗を確認した。

⑦ B-1、B-2工区遠景

- ・緑化状況を確認した。

写真撮影位置図

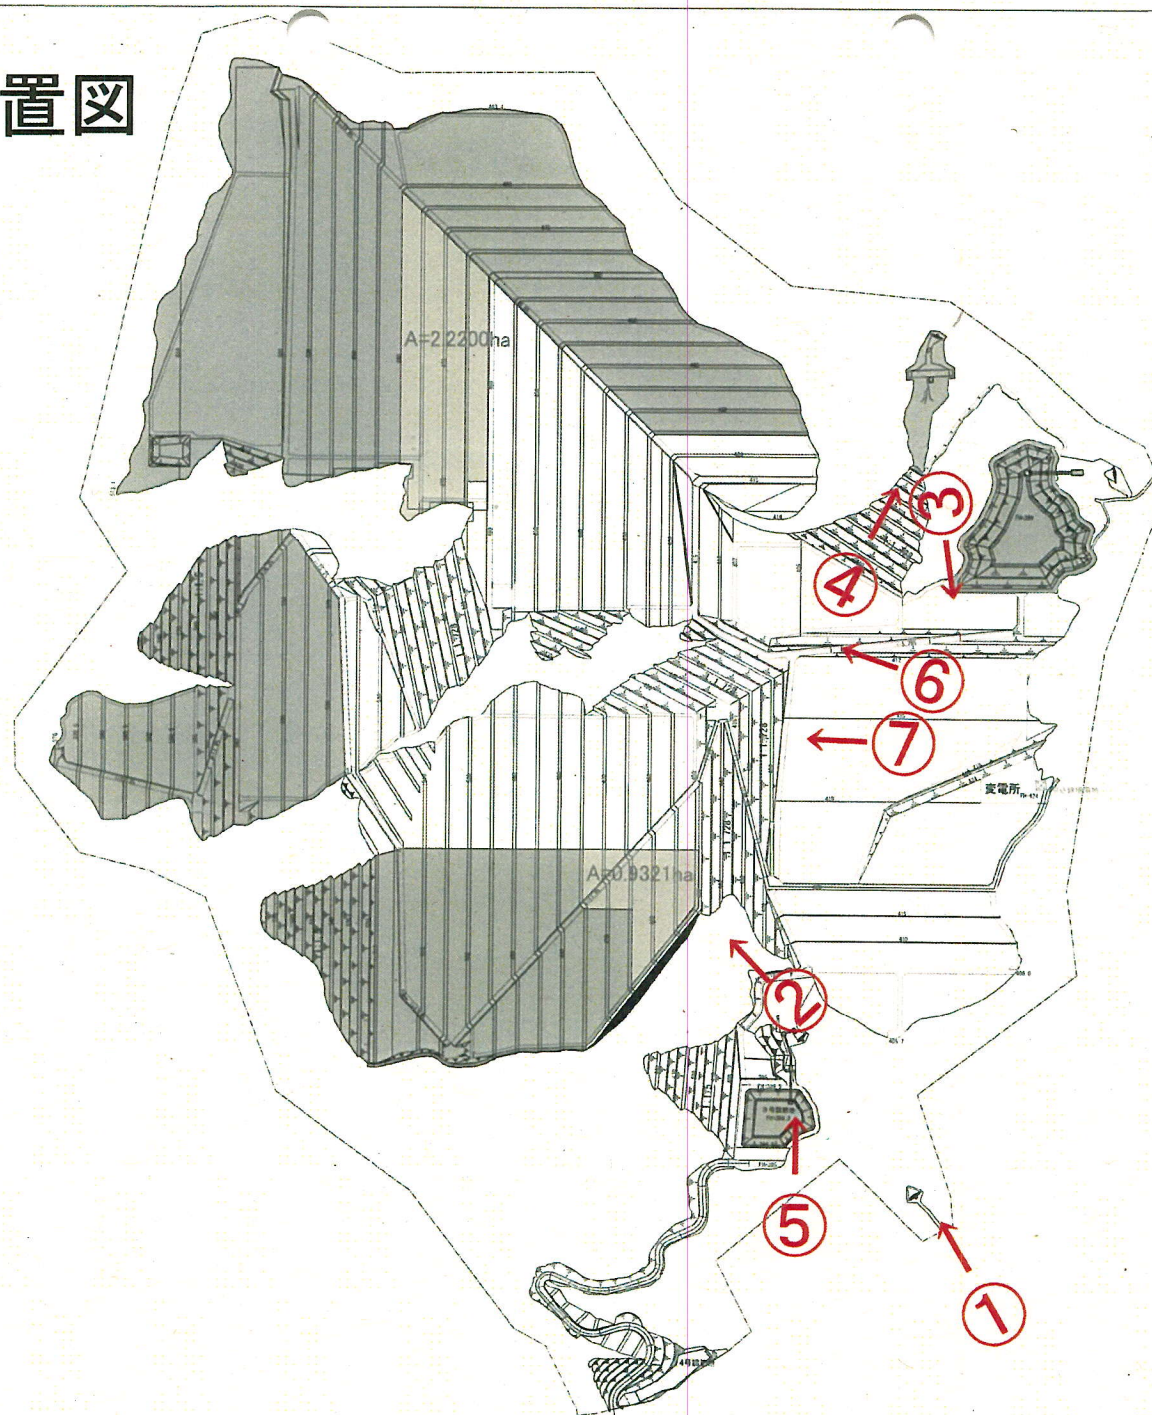

R61003 AC7 状況写真

① 3号調節池下流県道沿い仮設



② 3号調節池上流




③ 2号調節池流入部



④ 1号調節池放水塔



⑤ 3号調節池オリフィス

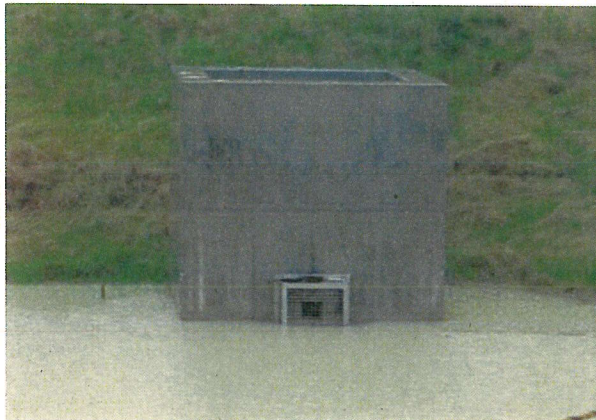

⑥A-1、A-2 工区遠景



⑦B-1、B-2 工区遠景



所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課長	課 員 (治山)	担 当 者
						

AC7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年10月17日（木）に現地確認を行いました、その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

- (1) 県北農林事務所森林林業部森林土木課長 蛭田利秀、副主査 菅野聖
- (2) XXXXXXXXXX

2 用務の経過、結末等

事業者より現場進捗及び9/22の雨被害復旧状況について説明があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

①③A-1, A-2 工区

- ・雨による浸食及び復旧状況を確認した。側溝の土砂上げ状況等を確認した。

②C 工区

- ・沈砂池の土砂撤去状況、掘削の進捗を確認した。

R61017 AC7 状況写真

①A-1, A-2 工区遠景 (B-1 工区より)




②C 工区遠景 (B-2 工区より)



③A-2 工区遠景 (A-1 工区より)



写真撮影位置

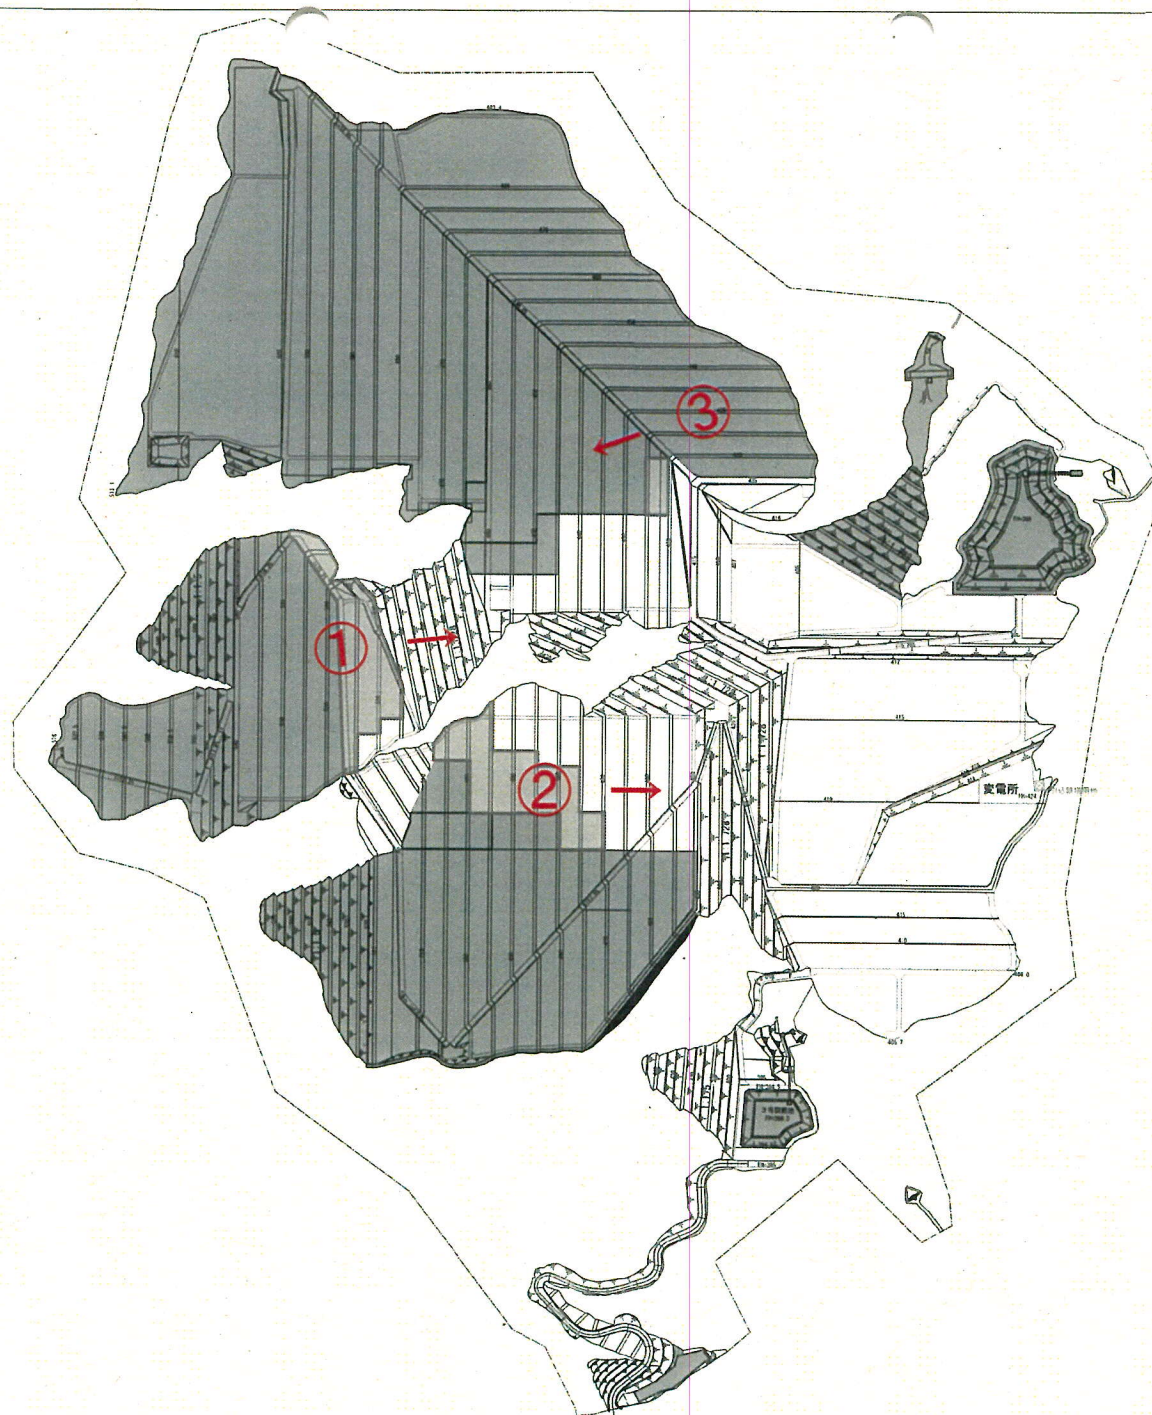

所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課長	課 員 (治山)	担 当 者
						

AC7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年11月1日（金）に現地確認を行いました、その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

(1) 県北農林事務所森林林業部長 國分真悟、副主査 菅野聖

(2) [REDACTED]

2 用務の経過、結末等

事業者より現場進捗及び9/22の雨被害復旧状況について説明があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

① 1号調節池

事業者より浚渫が完了したと説明があった。右側にある管は高盛土下部から伸ばしていたもので、不要になったため撤去した。オレンジ色のフロートは落葉等の流下を防ぐ目的で設置した。

② 2号調節池

ブルーシートの下部は地山であり、今後復旧工事の際にはラス張り等はせずに地山を生かして完了させる方針であると説明があった。

③ 2号池脇の湧水

2号池脇の掘削を進めたところ湧水があったと説明があった。


④ 2号池法面

植栽を実施していた。今後確認の際に活着率を確認するため、気をつけるよう指導。

⑤ 3号調節池脇

法面緑化が十分でない箇所を自主的に再吹き付けした。

写真撮影位置

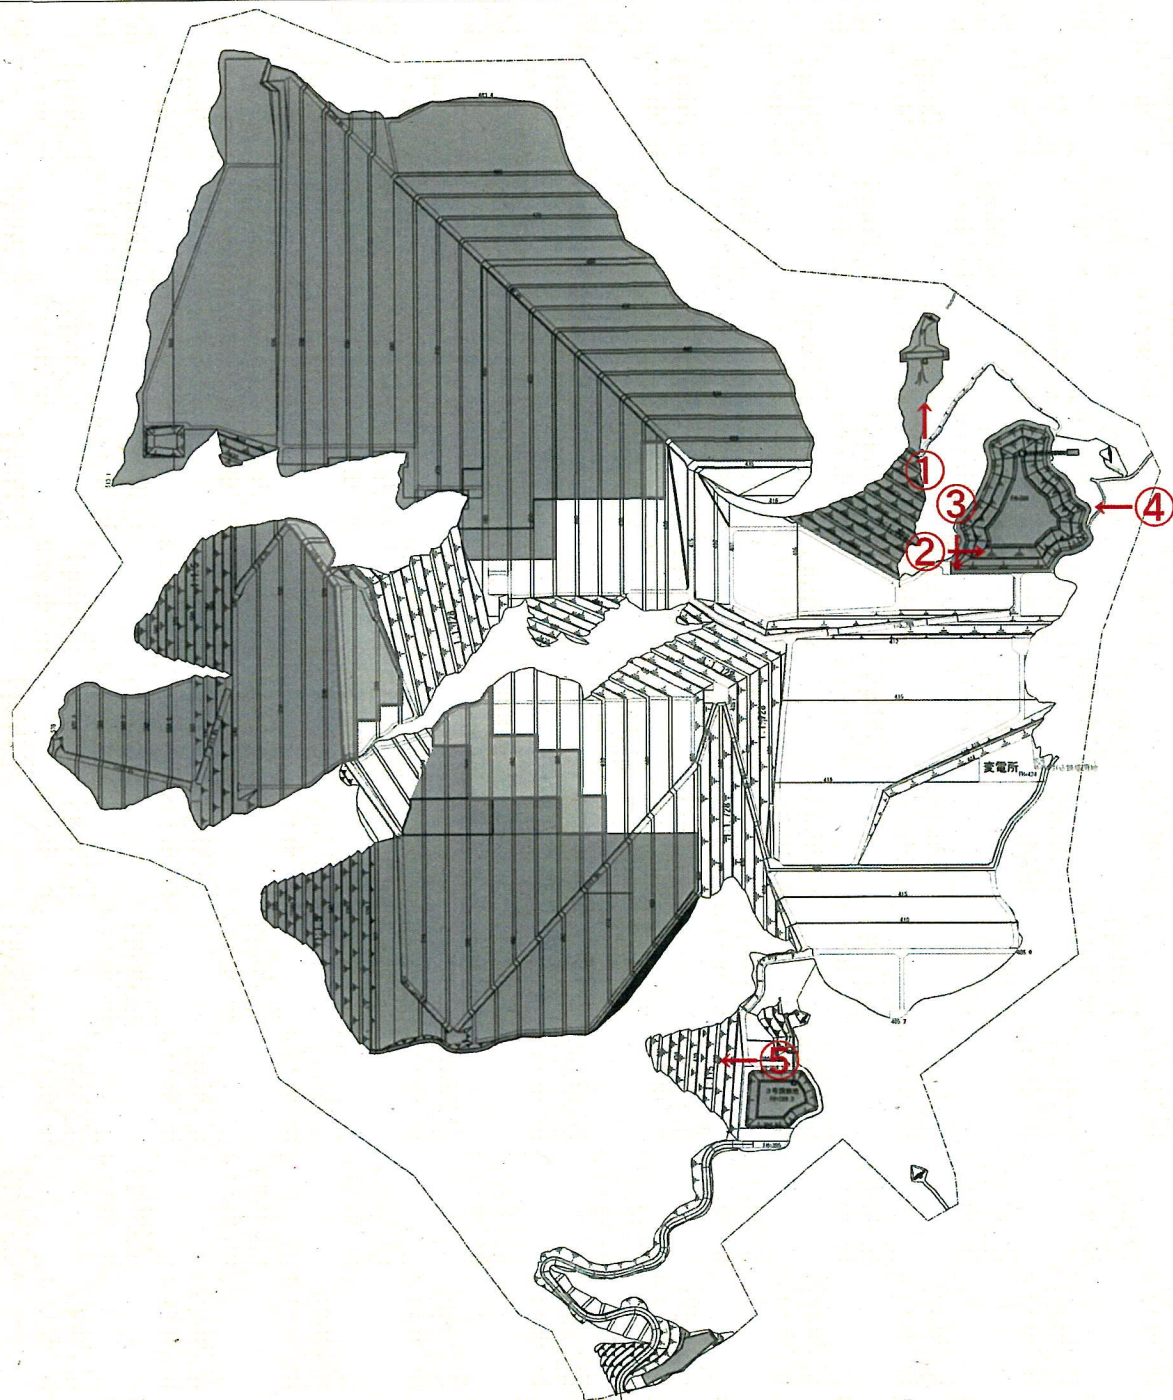

R61101 AC7 状況写真

①1号調節池



②2号調節池



③2号調節池脇の湧水



④2号調節池法面



⑤3号調節池脇の法面再吹き付け



所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課長	課 員 (治山)	担 当 者
						カンの 

AC7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年11月7日（木）に現地確認を行いました。その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

(1) 県北農林事務所森林林業部 森林土木課長 蛭田利秀、主査 阿部由紀子

(2) 

2 用務の経過、結末等

事業者より現場進捗について説明があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

- ① A-1 工区 緑化及びパネル設置状況
- ② A-2 工区 土工、排水路工、緑化状況
- ③ B-1 工区 緑化及びパネル設置状況
- ④ B-2 工区 土工、排水路工、緑化状況
- ⑤ 2号調節池への導水状況

部分完了位置図

凡例：

-  : 今回対象範囲
 A=2.2081ha
 : 確認済
 A=37.4072ha
 (開発面積=60.5736ha)



写真撮影位置図 R6. 11. 7.



①A-1工区



②A-2工区



③B-1工区



④B-2工区



⑤2号調節池

所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課長	課 員 (治山)	担 当 者
					  	たんぐ 

AC7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年11月15日（金）に現地確認を行いました。その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

- (1) 県北農林事務所森林林業部 森林土木課 主査 阿部由紀子 副主査藤巻幸歩
(2) XXXXXXXXXX

2 用務の経過、結末等

事業者より開発行為に関する報告があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

- ① B-1 工区、B-2 工区の間にある残置森林 0.0269ha
② 2号調節池隣の残置森林 0.5723ha



①B-1,B-2工区間



②B-1,B-2工区間



③2号調節池隣



④2号調節池隣 (2号調節池への導水対策)



⑤2号調節池隣 (仮沈砂池への導水対策)



⑥2号調節池隣 (仮沈砂池への導水対策)



⑦2号調節池隣 盛土部

所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課長	課 員 (治山)	担 当 者
					 	

AC7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年11月20日（水）に現地確認を行いました。その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

- (1) 県北農林事務所森林林業部 部長 国分真悟、副主査 藤巻幸歩
- (2) 森林保全課 主任主査 佐川大三
- (3) 

2 用務の経過、結末等


事業者より開発行為に関する報告があり、現場を確認した。

・主な確認箇所


- ① B-1 工区、B-2 工区の間にある残置森林 0.0269ha
- ② 2号調節池隣の残置森林 0.5723ha

現地確認(区域面積0.0269ha)




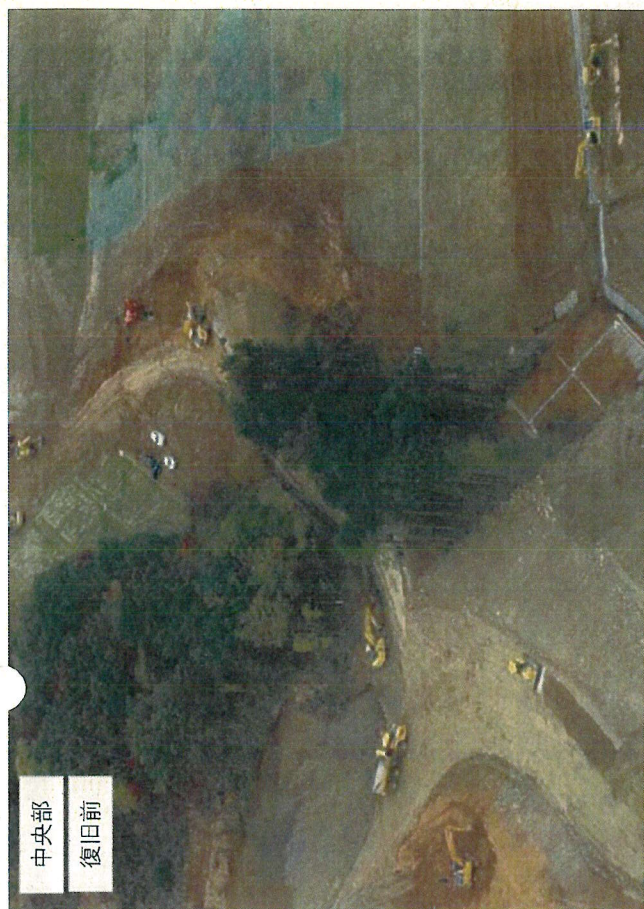

中央部
復旧前

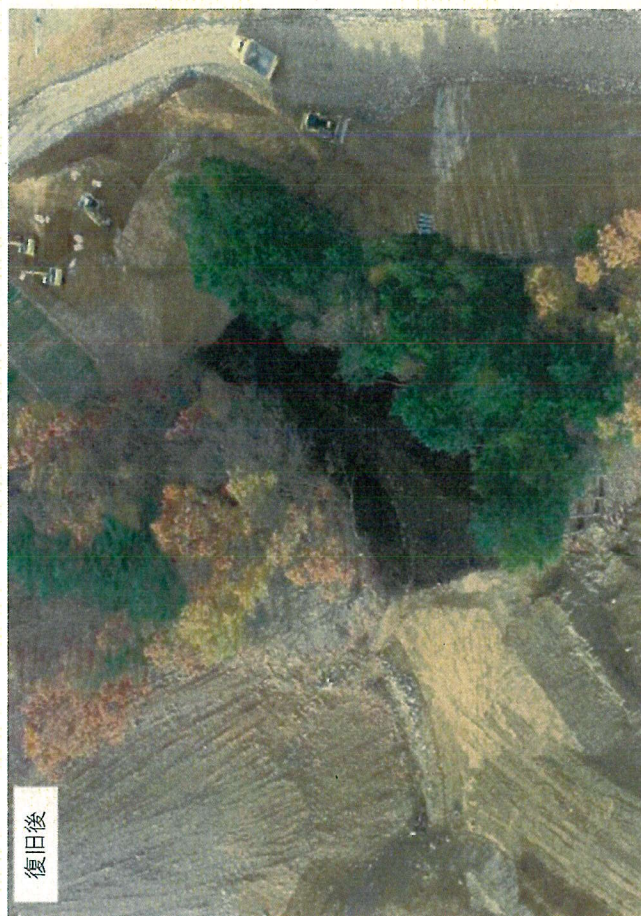

復旧後

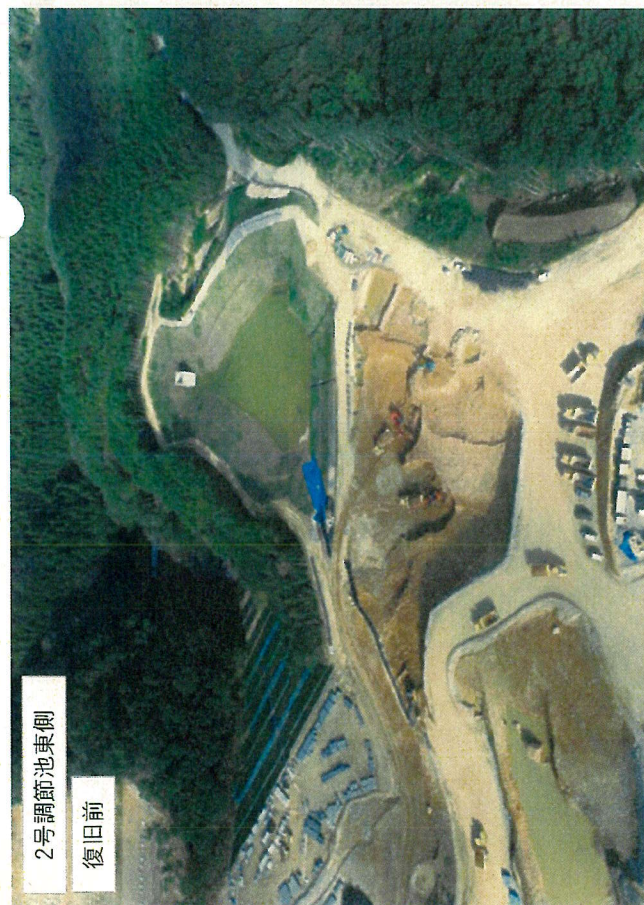

2号調節池東側
復旧前



復旧後

現地確認(区域面積0.5723ha)



所 長	次 長	部 長	主幹兼 副部長	課長	課 員 (治山)	担 当 者
						

AC7 林地開発に係る現地確認結果

令和6年12月6日（金）に現地確認を行いました。その結果は下記のとおりです。

1 対 応 者

- (1) 県北農林事務所 森林土木課長 蛭田利秀、副主査 菅野聖
- (2) 

2 用務の経過、結末等

事業者より開発行為に関する報告があり、現場を確認した。

・主な確認箇所

- ① 3号調節池下流県道沿い排水管
- ② 3号調節池の浚渫準備
- ③ 2号調節池仮設流入管の撤去
- ④ 2号調節池脇植栽部



① 3号調節池下流県道沿い排水管
 ・冬期除雪の支障にならないよう一部撤去
 ・春に再設置する



② 3号調節池の浚渫準備
 ・ポンプで4日から排水を実施
 ・来週以降浚渫を実施する



③ 2号調節池仮設流入管の撤去
 ・造成の進展に伴い仮設配管を撤去
 ・土側溝により調節池に流下している。





④ 2号調節池脇植栽部
 ・造成森林部分に変状ないこと確認

部分完了位置図

凡例：

- : 今回対象範囲
A=1.0492ha
- : 確認済
A=39.6153ha
(開発面積=60.5736ha)

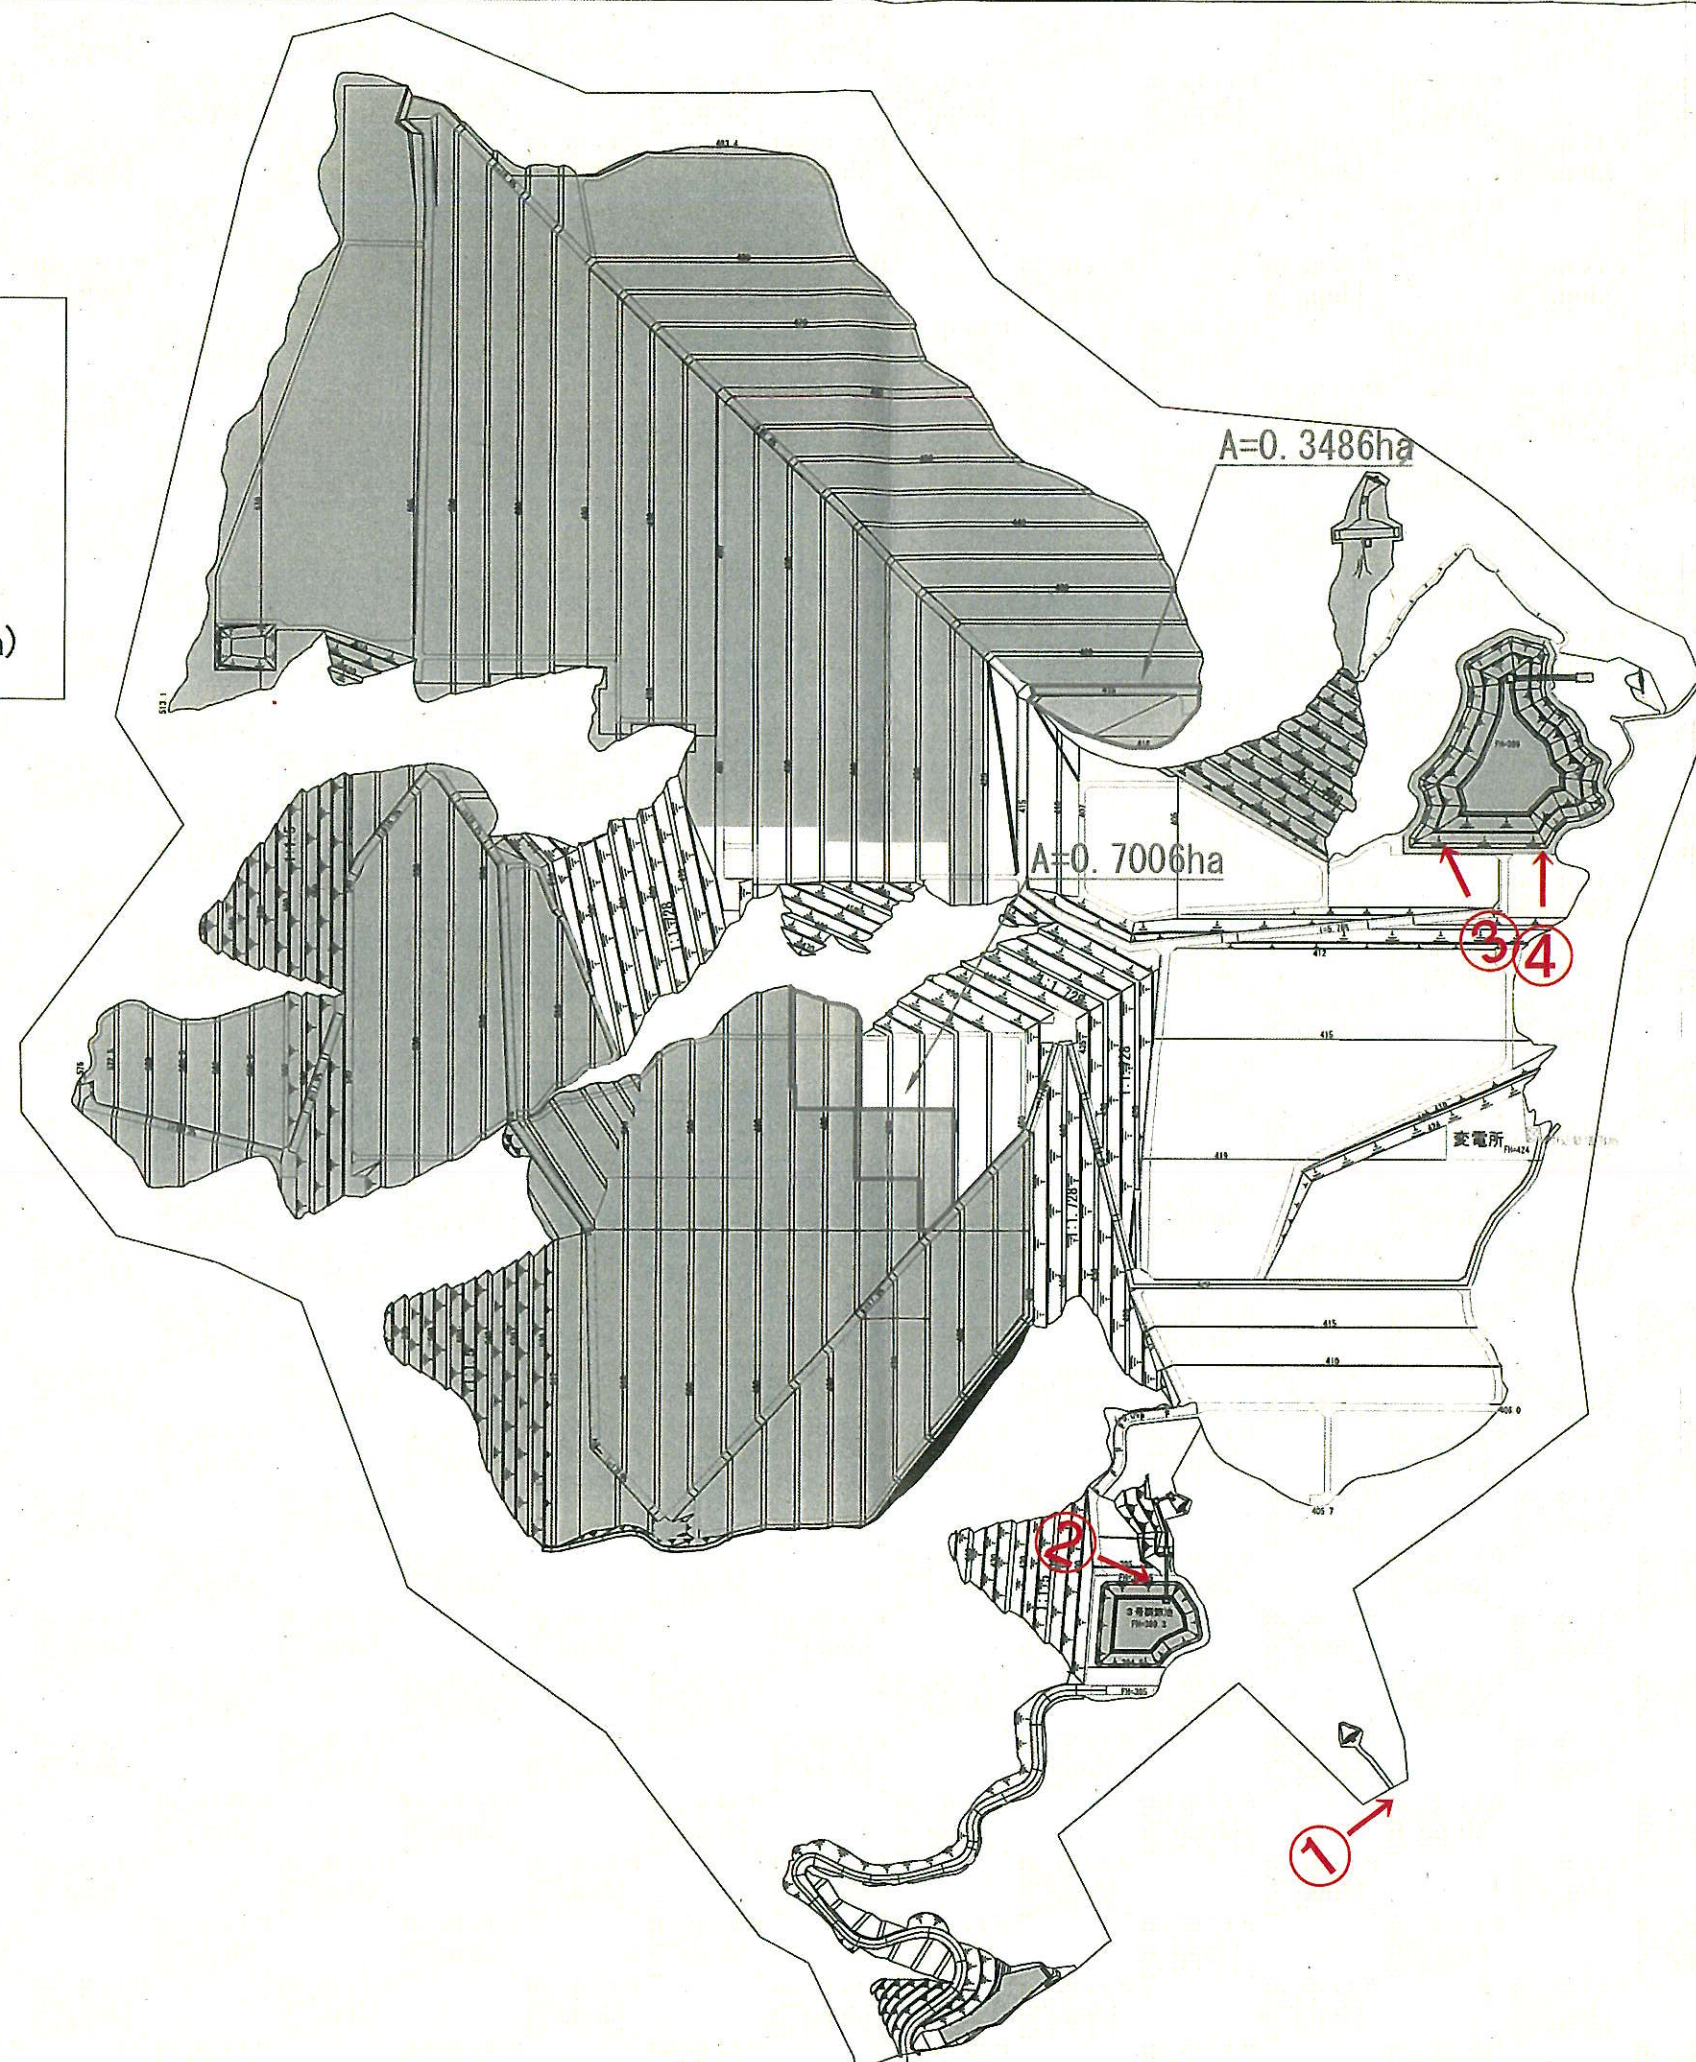



① 3号調節池浚渫状況




②A 工区植栽状況



③ 2号調節池現況



① 2号調節池上流部
・除雪を実施

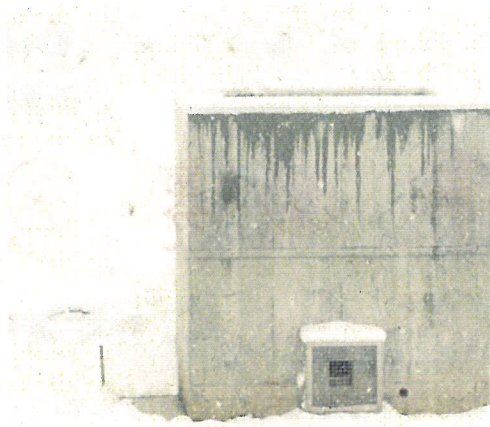

② 3号調節池オリフィス
・高圧洗浄水を流入させている
・水位はオリフィス以下



② B-1, B-2 工区積雪状況
・道路部の除雪実施を確認した。
